

Ciclo de Vida do Projeto, Fatores Críticos de Sucesso e Introdução ao PMBOK

Prof. Marcelo Semmer

Universidade do Contestado - Campus Mafra

UNC
Universidade
do Contestado

Agenda

1

Ciclo de Vida do Projeto

Fases, características e importância para o sucesso do projeto

2

Fatores Críticos de Sucesso

Elementos essenciais que determinam o sucesso ou fracasso de projetos

3

Introdução ao PMBOK

Guia de melhores práticas em gerenciamento de projetos do PMI

4

Aplicabilidade Profissional

Como aplicar esses conhecimentos na prática profissional

UNC
Universidade
do Contestado

Conceito de Projeto

Antes de entrarmos no ciclo de vida, vamos entender o que é um projeto:

> "Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único."

Características fundamentais:

- Temporário (início e fim definidos)
- Entrega de resultados específicos
- Progressivamente elaborado
- Requer recursos dedicados



Ciclo de Vida do Projeto: Visão Geral

O ciclo de vida representa as fases sequenciais pelas quais um projeto passa do início ao encerramento.



Iniciação

Identificação da necessidade e autorização formal



Planejamento

Definição detalhada do escopo, cronograma e recursos



Execução

Implementação do plano e coordenação de recursos



Monitoramento e Controle

Acompanhamento e ajustes necessários



Encerramento

Finalização formal e documentação

UNC
Universidade
do Contestado

Características do Ciclo de Vida

Progressão sequencial

As fases geralmente seguem uma ordem lógica, embora possam se sobrepor em alguns modelos.

Entregas específicas


Cada fase tem resultados e marcos definidos que devem ser aprovados antes de prosseguir.

Níveis variáveis de esforço

O esforço, custos e alocação de recursos variam ao longo do ciclo, geralmente com pico na execução.

Adaptável

O ciclo de vida pode e deve ser adaptado às características específicas do projeto e da organização.

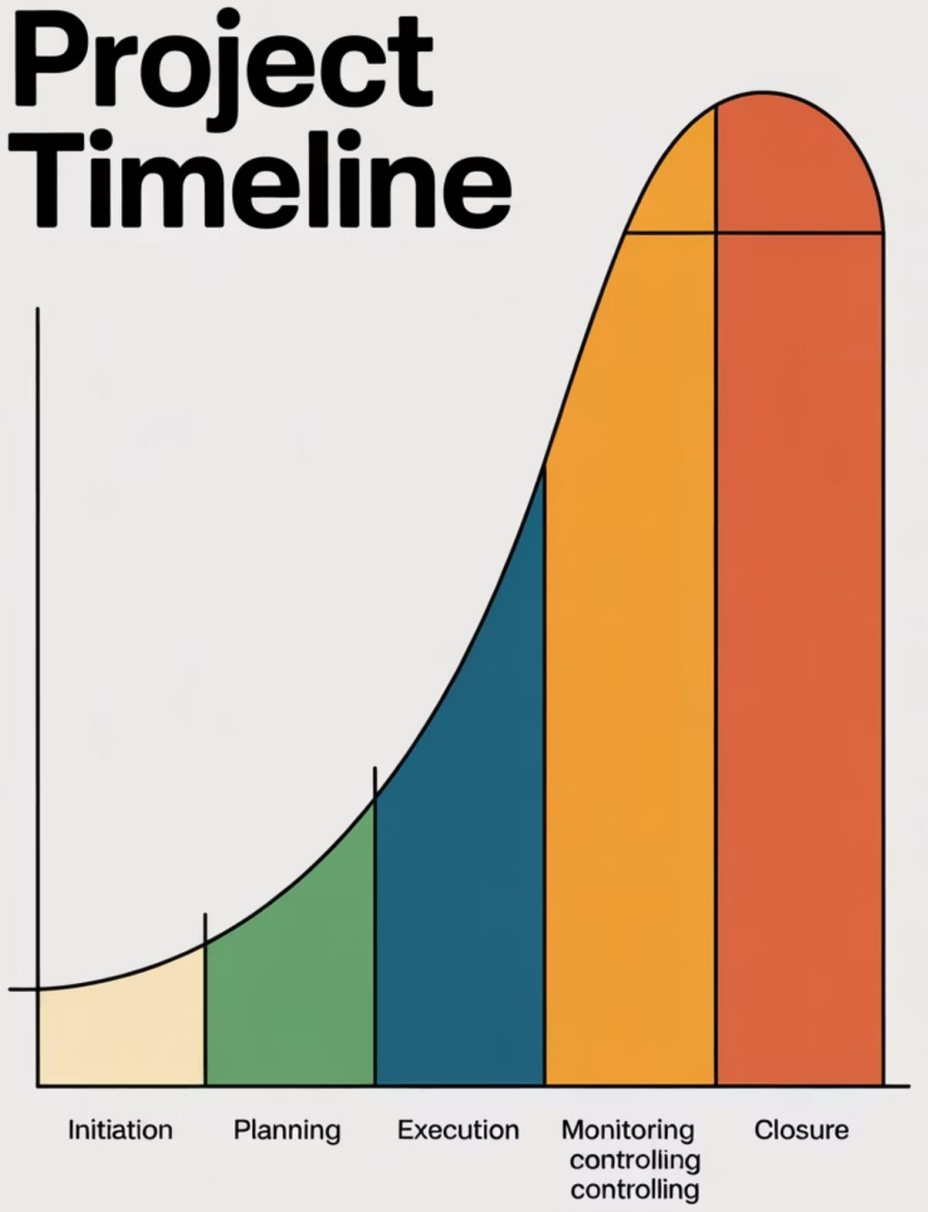


Fase de Iniciação

Principais atividades:

- Identificação da necessidade ou oportunidade de negócio
- Análise preliminar de viabilidade
- Definição de objetivos de alto nível
- Identificação dos principais stakeholders
- Nomeação do gerente de projeto
- Elaboração e aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP)

A fase de iniciação estabelece as bases para todo o projeto e determina se ele deve ou não prosseguir.

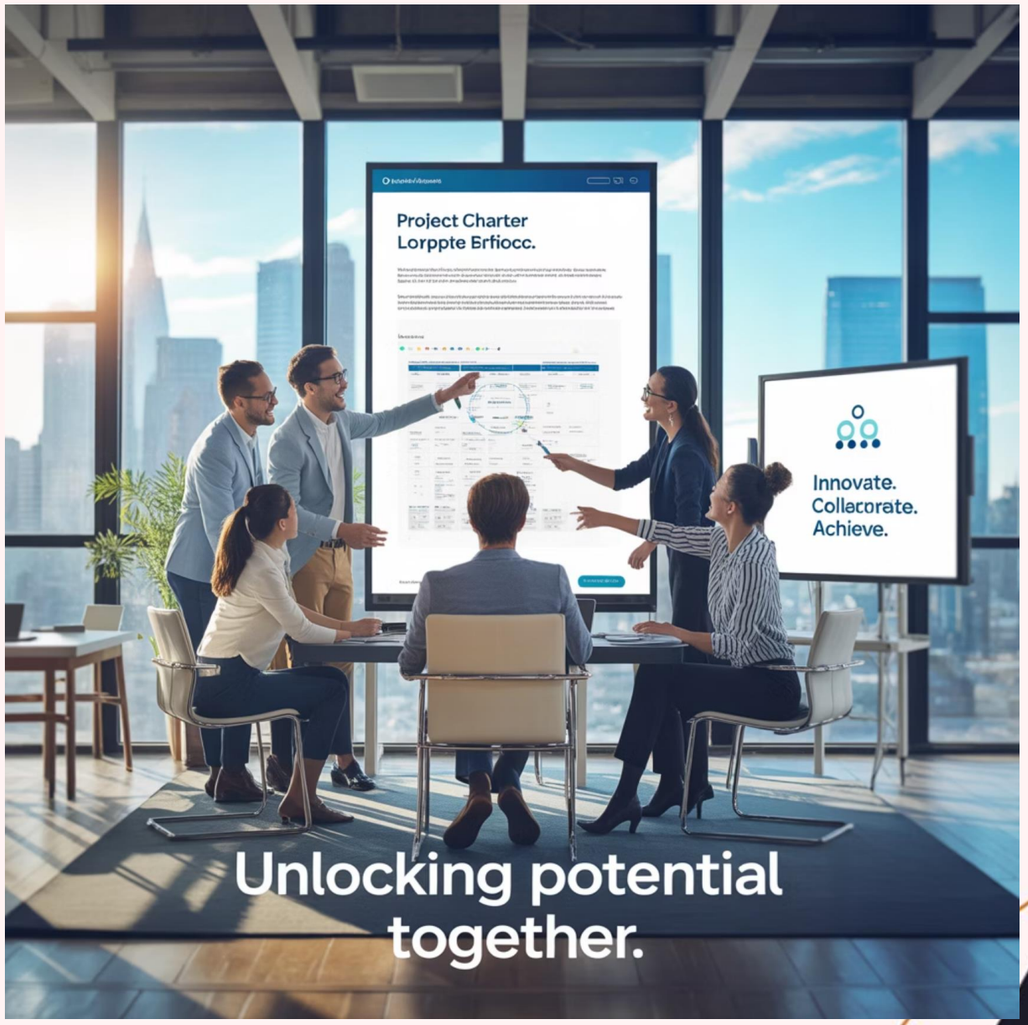

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é o documento que formaliza a existência do projeto e confere autoridade ao gerente do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Propósito e justificativa

Por que o projeto existe e quais benefícios ele trará

Objetivos e critérios de sucesso

O que o projeto pretende alcançar e como será medido

Requisitos de alto nível

Principais entregáveis e restrições conhecidas

Riscos iniciais

Principais ameaças e oportunidades identificadas

Cronograma de marcos

Datas importantes para entregas e decisões

Orçamento estimado

Estimativa inicial de recursos financeiros necessários

Partes interessadas

Principais stakeholders e seus interesses

Autoridade do gerente

Nível de autonomia e responsabilidades concedidas

UNC
Universidade
do Contestado

Fase de Planejamento


Principais atividades:

- Refinamento do escopo do projeto
- Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
- Desenvolvimento do cronograma detalhado
- Estimativa e alocação de recursos
- Planejamento da qualidade
- Identificação e análise de riscos
- Planejamento das comunicações
- Definição da estratégia de aquisições



O planejamento define o **quê**, **como**, **quando**, **quem** e **quanto** será necessário para executar o projeto com sucesso.

UNC
Universidade
do Contestado

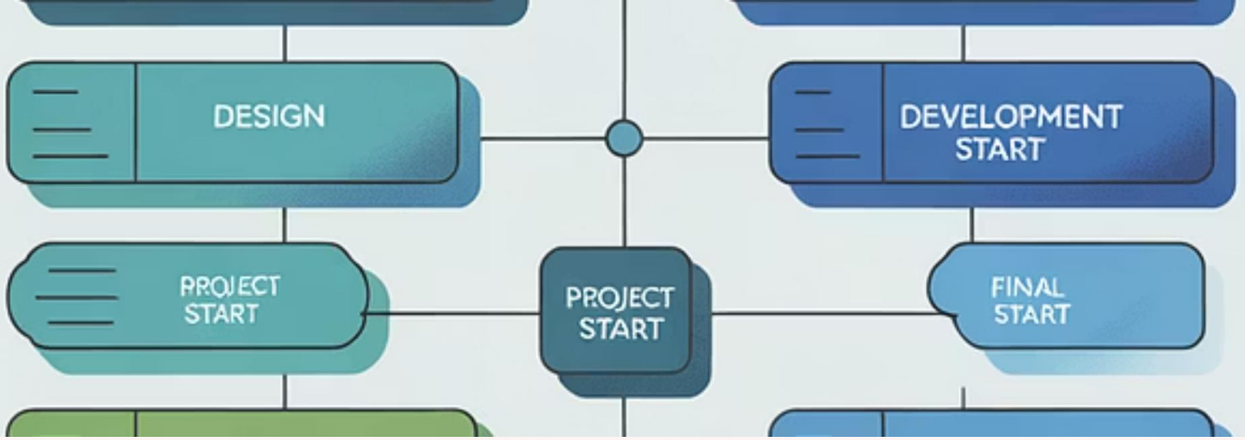

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto para atingir os objetivos e criar as entregas requeridas.

Benefícios da EAP

- Organiza e define o escopo total do projeto
- Facilita a atribuição de responsabilidades
- Serve como base para estimativas de custos e prazos
- Proporciona uma visão completa do projeto

Regra dos 100%

A EAP inclui 100% do trabalho definido no escopo do projeto e captura todas as entregas (internas, externas e interinas).

Plano de Gerenciamento do Projeto

Documento que integra e consolida todos os planos de gerenciamento auxiliares e linhas de base dos processos de planejamento.

Plano de Gerenciamento do Escopo

Como o escopo será definido, validado e controlado

Plano de Gerenciamento do Cronograma

Como as atividades serão sequenciadas e o progresso será monitorado

Plano de Gerenciamento dos Custos

Como os custos serão estimados, orçados e controlados

Plano de Gerenciamento da Qualidade

Como os requisitos de qualidade serão atendidos

Plano de Gerenciamento de Recursos

Como os recursos humanos e materiais serão adquiridos e gerenciados

Plano de Gerenciamento das Comunicações

Como as informações do projeto serão coletadas e distribuídas

UNC
Universidade
do Contestado

Planos de Gerenciamento (continuação)

Plano de Gerenciamento dos Riscos

Como os riscos serão identificados, analisados e tratados

Plano de Gerenciamento das Aquisições

Como serão planejadas e executadas as compras necessárias

Plano de Engajamento das Partes Interessadas

Como os stakeholders serão envolvidos nas decisões e execução

Plano de Gerenciamento de Mudanças

Como as solicitações de mudança serão avaliadas e implementadas

Cada plano pode ser detalhado ou simplificado de acordo com a complexidade do projeto e as necessidades da organização.

UNC
Universidade
do Contestado

Fase de Execução

Principais atividades:

- Coordenação de pessoas e recursos
- Realização das atividades planejadas
- Implementação dos planos de gerenciamento
- Produção das entregas do projeto
- Coleta de dados de desempenho
- Gerenciamento das expectativas dos stakeholders
- Implementação de aprovações e mudanças aprovadas



A fase de execução consome a maior parte dos recursos do projeto e exige forte liderança e habilidades interpessoais do gerente de projetos.

UNC
Universidade
do Contestado

Desafios na Fase de Execução

Conflitos na equipe

Divergências de opinião, prioridades conflitantes e problemas de comunicação são comuns e precisam ser gerenciados adequadamente.

Mudanças de escopo

Solicitações de mudança frequentes podem desestabilizar o projeto se não forem devidamente avaliadas e controladas.

Variações de desempenho

Desvios em relação ao planejado em termos de prazos, custos e qualidade requerem ações corretivas rápidas.

Problemas de comunicação

Falhas na comunicação entre a equipe e stakeholders podem levar a retrabalho, atrasos e insatisfação.

UNC
Universidade
do Contestado

Fase de Monitoramento e Controle

Principais atividades:

- Acompanhamento do progresso do projeto
- Comparação do desempenho real com o planejado
- Análise de variações e tendências
- Avaliação de solicitações de mudança
- Implementação de ações corretivas e preventivas
- Garantia da qualidade das entregas
- Comunicação do status aos stakeholders



O monitoramento e controle ocorrem paralelamente à execução, desde o início até o encerramento do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Ferramentas de Monitoramento e Controle

Análise de Valor Agregado (EVA)

Método que integra escopo, cronograma e recursos para medir o desempenho e o progresso do projeto. Utiliza métricas como VP (Valor Planejado), VA (Valor Agregado) e CR (Custo Real).

Gráficos de Controle

Ferramentas estatísticas que ajudam a determinar se um processo está sob controle ou se apresenta variações que exigem atenção especial.

Reuniões de Status

Encontros periódicos para revisar o progresso, discutir problemas e tomar decisões. Podem ser diárias (como no Scrum), semanais ou quinzenais.

Relatórios de Desempenho

Documentos que consolidam informações sobre o status do projeto, incluindo indicadores de desempenho, riscos, problemas e próximos passos.

UNC
Universidade
do Contestado

Análise de Valor Agregado (EVA)

A Análise de Valor Agregado é uma técnica que permite avaliar o desempenho do projeto integrando medidas de escopo, cronograma e custos.

Principais métricas:

- **VP (Valor Planejado):** Quanto deveria ter sido gasto até o momento
- **VA (Valor Agregado):** Valor do trabalho efetivamente realizado
- **CR (Custo Real):** Quanto foi efetivamente gasto até o momento

Indicadores de desempenho:

- **IDC (Índice de Desempenho de Custos):** VA/CR
- **IDP (Índice de Desempenho de Prazos):** VA/VP



IDC > 1: Projeto abaixo do orçamento

IDC < 1: Projeto acima do orçamento

IDP > 1: Projeto adiantado

IDP < 1: Projeto atrasado

UNC
Universidade
do Contestado

Controle Integrado de Mudanças


Processo de revisar todas as solicitações de mudança, aprovar ou rejeitar as mudanças, e gerenciar as mudanças nas entregas, documentos e planos do projeto.

Solicitação de Mudança

Identificação e documentação formal da necessidade de mudança

Implementação

Execução da mudança aprovada e comunicação aos stakeholders

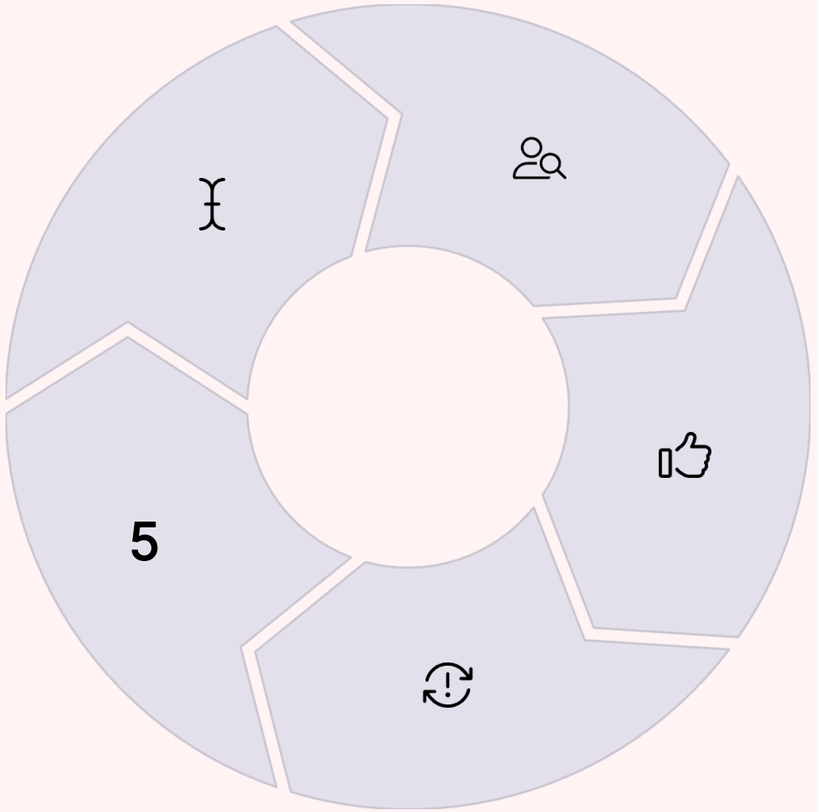

Análise de Impacto

Avaliação dos efeitos da mudança em escopo, tempo, custo e qualidade

Aprovação/Rejeição

Decisão baseada na análise de impacto e alinhamento estratégico

Atualização dos Planos

Revisão e ajuste de documentos e planos afetados

UNC
Universidade
do Contestado

Fase de Encerramento

Principais atividades:

- Verificação e aceitação formal das entregas
- Transferência do produto ou serviço para a operação
- Liberação dos recursos da equipe
- Encerramento de contratos com fornecedores
- Arquivamento da documentação do projeto
- Documentação das lições aprendidas
- Celebração das conquistas



O encerramento formal é essencial para garantir que nenhuma pendência fique aberta e que o conhecimento gerado no projeto seja preservado.

UNC
Universidade
do Contestado

Lições Aprendidas

O registro de lições aprendidas é um ativo organizacional valioso que contribui para a melhoria contínua dos processos de gerenciamento de projetos.

O que funcionou bem?

- Práticas eficazes que devem ser mantidas
- Técnicas e ferramentas que trouxeram bons resultados
- Decisões acertadas que beneficiaram o projeto

O que poderia ser melhorado?

- Desafios enfrentados e como poderiam ser superados
- Estimativas que se mostraram incorretas
- Processos que precisam ser revistos

Recomendações para projetos futuros

- Sugestões concretas para evitar problemas similares
- Ações preventivas para riscos identificados
- Melhorias nos processos de gerenciamento



Diferentes Modelos de Ciclo de Vida



Modelo Preditivo (Cascata)

Sequencial e linear, com fases bem definidas que ocorrem uma após a outra. Adequado para projetos com requisitos estáveis e bem definidos.



Modelo Iterativo

Repete as fases em ciclos, refinando o produto a cada iteração. Permite feedback mais cedo e ajustes no caminho.



Modelo Incremental

Entrega o produto em partes funcionais (incrementos), adicionando funcionalidades a cada entrega.



Modelo Adaptativo (Ágil)

Altamente flexível, focado na adaptação a mudanças e colaboração com o cliente. Entregas frequentes de valor.



Modelo Híbrido

Combina elementos de diferentes abordagens para atender às necessidades específicas do projeto e da organização.

UNC
Universidade
do Contestado

Comparação entre Modelos de Ciclo de Vida

Modelo	Vantagens	Desvantagens	Aplicações típicas
Cascata	Fácil de entender e gerenciar; documentação abrangente	Pouca flexibilidade; valor entregue apenas no final	Projetos de construção, projetos regulamentados
Iterativo	Feedback contínuo; riscos identificados mais cedo	Pode ser difícil definir quando parar de iterar	Produtos com interface complexa com usuários
Incremental	Entregas de valor mais cedo; maior visibilidade	Requer boa arquitetura inicial; possível retrabalho	Desenvolvimento de sistemas modulares
Ágil	Adaptação rápida a mudanças; satisfação do cliente	Menor previsibilidade; documentação menos formal	Desenvolvimento de software, ambientes dinâmicos
Híbrido	Flexibilidade para adaptar ao contexto específico	Maior complexidade de gerenciamento	Projetos grandes e complexos com múltiplos componentes

UNC
Universidade
do Contestado

Fatores Críticos de Sucesso em Projetos

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são os elementos essenciais que determinam o sucesso ou fracasso de um projeto. Identificá-los e gerenciá-los adequadamente aumenta significativamente as chances de alcançar os objetivos do projeto.


> "O sucesso de um projeto não acontece por acaso, mas como resultado da atenção constante aos fatores que realmente importam."



Os FCS variam de acordo com o tipo de projeto, o setor da organização e o contexto, mas alguns são recorrentes em estudos e pesquisas sobre o tema.


UNC
Universidade
do Contestado

Principais Fatores Críticos de Sucesso




Patrocínio executivo forte

Apoio visível e comprometido da alta direção, garantindo recursos e tomando decisões rápidas.




Objetivos claros e bem definidos

Escopo e metas SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais).




Planejamento eficaz

Detalhamento adequado do projeto, com estimativas realistas e contingências apropriadas.



Comunicação eficiente

Canais abertos e transparentes com todos os stakeholders, promovendo alinhamento e engajamento.



Gestão de riscos

Identificação, análise e resposta proativa aos riscos do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Fatores Críticos de Sucesso (continuação)

Equipe capacitada e engajada

Profissionais com as competências técnicas e comportamentais adequadas, motivados e comprometidos com os objetivos do projeto.

Engajamento dos stakeholders

Envolvimento ativo das partes interessadas relevantes em todas as fases do projeto, especialmente na tomada de decisões.

Processos e metodologias adequados

Utilização de práticas de gerenciamento adaptadas ao contexto e à complexidade do projeto.

Monitoramento constante

Acompanhamento regular do progresso, com indicadores claros e ações corretivas rápidas quando necessário.

UNC
Universidade
do Contestado

Patrocínio Executivo Forte

O patrocinador do projeto (sponsor) é um executivo de alto nível que defende o projeto dentro da organização e garante os recursos necessários para seu sucesso.

Responsabilidades do patrocinador:

- Garantir o alinhamento estratégico do projeto
- Aprovar recursos e orçamento
- Remover obstáculos organizacionais
- Tomar decisões críticas e aprovar mudanças importantes
- Defender o projeto perante a alta direção
- Fornecer orientação ao gerente do projeto



"Um projeto sem um patrocinador forte é como um barco sem leme, vulnerável às marés organizacionais."

Segundo o PMI, projetos com patrocínio executivo ativo têm taxas de sucesso 40% maiores do que aqueles sem apoio da alta direção.

UNC
Universidade
do Contestado

Objetivos Claros e Bem Definidos

Objetivos claros fornecem direção e propósito ao projeto, permitindo que a equipe entenda o que precisa ser alcançado e por quê.



Específicos

Claramente definidos, sem ambiguidades. Responde à pergunta: O quê exatamente queremos alcançar?



Mensuráveis

Possíveis de serem medidos e quantificados. Responde à pergunta: Como saberemos que alcançamos?



Alcançáveis

Desafiadores, mas viáveis com os recursos disponíveis. Responde à pergunta: É possível realizar?



Relevantes

Alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Responde à pergunta: Por que isso importa?



Temporais

Com prazos definidos para conclusão. Responde à pergunta: Quando deve ser concluído?


UNC
Universidade
do Contestado

Comunicação Eficiente

A comunicação é frequentemente citada como o fator mais crítico para o sucesso do projeto. Ela permeia todas as atividades e relacionamentos no projeto.

Aspectos essenciais:

- **Transparência:** Informações claras e honestas sobre o status, desafios e decisões
- **Frequência adequada:** Comunicação regular, sem sobrecarga ou escassez de informações
- **Canais apropriados:** Utilização dos meios mais eficazes para cada tipo de mensagem e público
- **Feedback:** Abertura para receber e fornecer retorno construtivo
- **Documentação:** Registro adequado das informações importantes e decisões

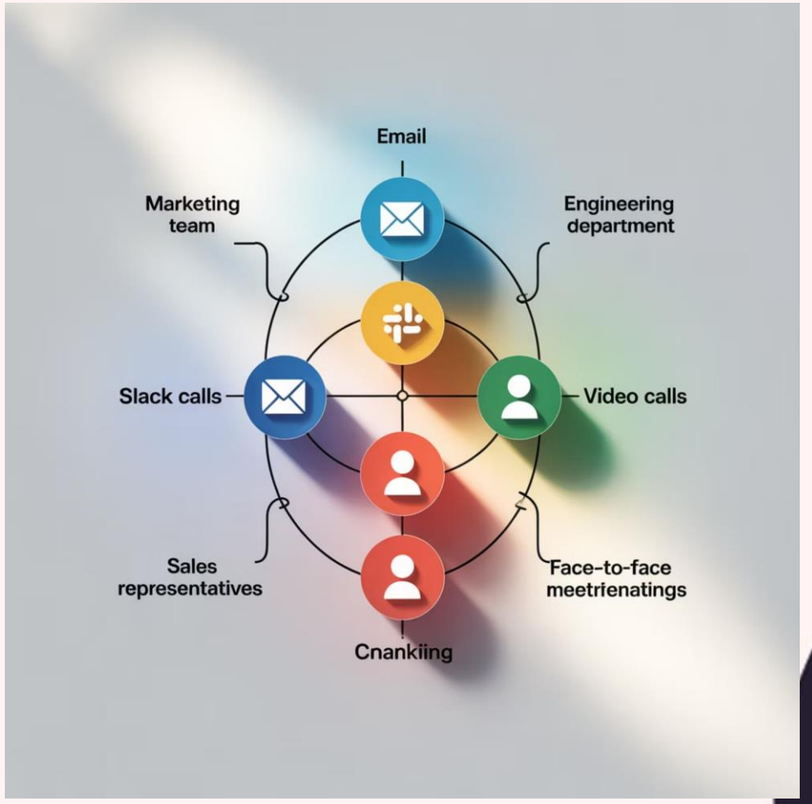

⚠ Estudos indicam que 56% dos projetos fracassam devido a problemas de comunicação inadequada entre a equipe, stakeholders e liderança.

UNC Universidade do Contestado

Gestão de Riscos


A gestão proativa de riscos permite identificar, analisar e responder a eventos que podem impactar positiva ou negativamente os objetivos do projeto.

Identificação de Riscos

Levantamento de todos os possíveis riscos que podem afetar o projeto

Monitoramento e Controle

Acompanhamento contínuo e implementação das respostas quando necessário

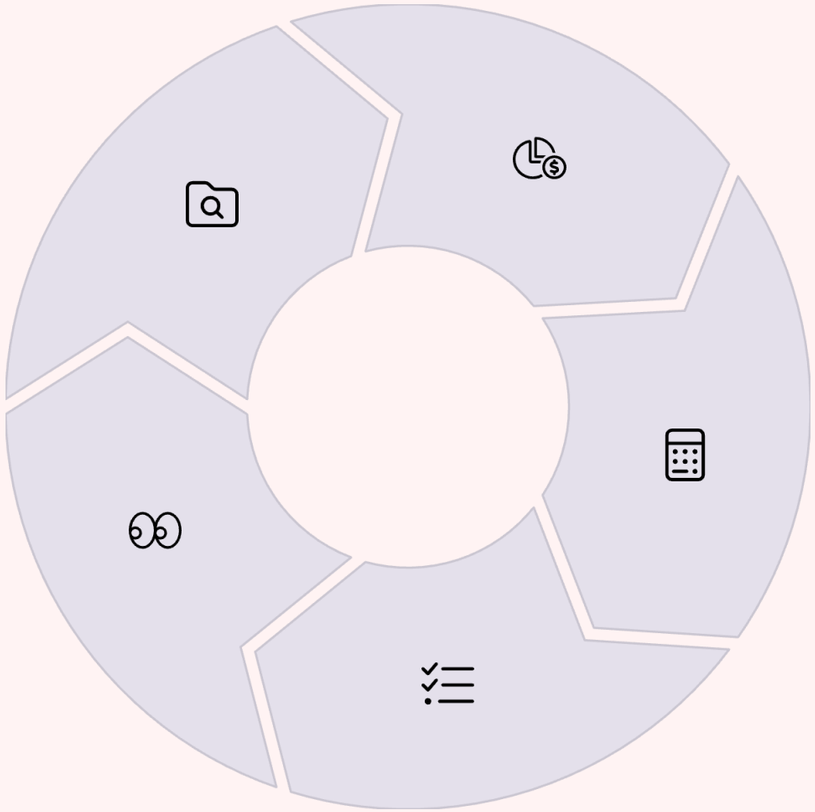

Análise Qualitativa

Avaliação da probabilidade e impacto de cada risco


Análise Quantitativa

Quantificação numérica do efeito dos riscos nos objetivos

Planejamento de Respostas

Definição de estratégias para lidar com os riscos identificados

UNC
Universidade
do Contestado

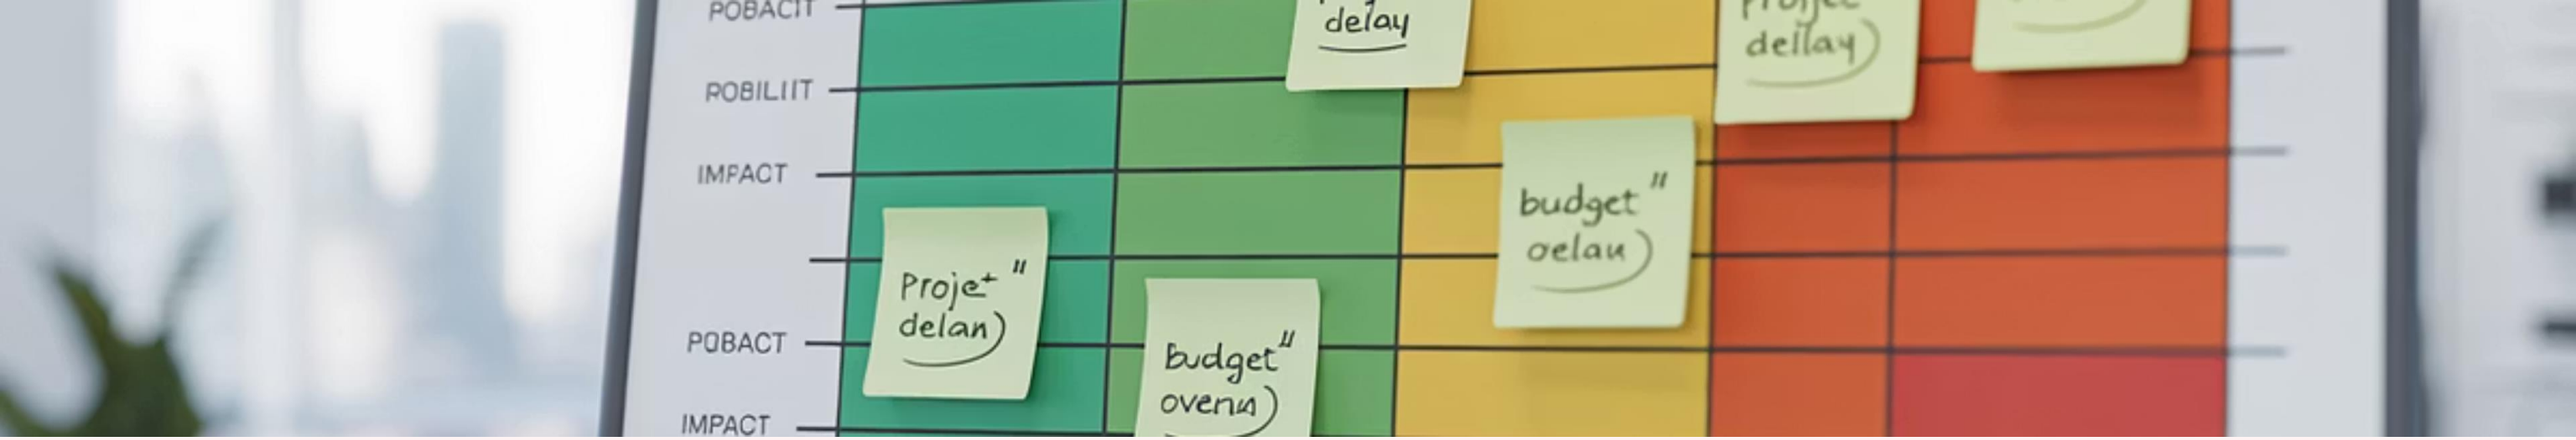

Estratégias de Resposta a Riscos

Estratégias para riscos negativos (ameaças)

- **Evitar:** Eliminar a ameaça mudando o plano do projeto
- **Transferir:** Passar o impacto e a responsabilidade para terceiros
- **Mitigar:** Reduzir a probabilidade ou o impacto a um nível aceitável
- **Aceitar:** Reconhecer o risco sem tomar ações prévias

Estratégias para riscos positivos (oportunidades)

- **Explorar:** Garantir que a oportunidade seja aproveitada
- **Melhorar:** Aumentar a probabilidade ou o impacto positivo
- **Compartilhar:** Transferir a propriedade para um terceiro mais capaz
- **Aceitar:** Estar disposto a aproveitar se a oportunidade ocorrer

UNC
Universidade
do Contestado

Equipe Capacitada e Engajada

Uma equipe de projeto eficaz é formada por pessoas com as habilidades técnicas necessárias, mas também com competências comportamentais e motivação para alcançar os objetivos do projeto.

Fatores-chave para o engajamento da equipe:

- Propósito claro e significativo
- Papéis e responsabilidades bem definidos
- Autonomia e empoderamento
- Reconhecimento e valorização
- Desenvolvimento profissional
- Ambiente colaborativo e de confiança
- Liderança inspiradora



Equipes altamente engajadas apresentam produtividade até 21% maior e menor rotatividade, reduzindo riscos de perda de conhecimento no projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Causas Comuns de Fracasso em Projetos

68%

Mudança de Escopo

Projetos que sofrem com escopo mal definido ou com mudanças frequentes não gerenciadas adequadamente.

54%

Comunicação Insuficiente

Falhas na comunicação entre equipe, stakeholders e gerência, levando a mal-entendidos e expectativas desalinhadas.

47%

Recursos Inadequados

Falta de pessoas, tempo, orçamento ou tecnologia necessários para realizar o projeto conforme planejado.

39%

Pouco Apoio Executivo

Ausência de patrocínio forte e visível da alta direção, resultando em baixa prioridade organizacional.

Fonte: Pesquisa PMI Pulse of the Profession (dados adaptados para fins educacionais)

UNC
Universidade
do Contestado

Introdução ao PMBOK

O **Project Management Body of Knowledge (PMBOK)** é um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI).

O PMBOK não é uma metodologia específica, mas sim um conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas amplamente reconhecidos como boas práticas no gerenciamento de projetos.



Características do PMBOK:

- Reconhecido globalmente como padrão
- Aplicável a diversos tipos de projetos
- Base para certificações profissionais
- Evolui constantemente (atualmente na 7ª edição)

A 7ª edição do PMBOK, lançada em 2021, trouxe uma mudança significativa na abordagem, saindo de uma visão baseada em processos para uma abordagem baseada em princípios e domínios de desempenho.

UNC
Universidade
do Contestado

Evolução do PMBOK

1

1996 - 1ª Edição

Primeira publicação oficial do guia PMBOK, estabelecendo as bases do gerenciamento de projetos.

2

2000 - 2ª Edição

Expandiu o conteúdo e refinou os processos, introduzindo o conceito de áreas de conhecimento.

3

2004 - 3ª Edição

Atualizou as práticas e ampliou a estrutura, tornando-se mais abrangente.

4

2008 - 4ª Edição

Melhorou a consistência e clareza dos processos e suas interações.

5

2013 - 5ª Edição

Adicionou a área de conhecimento de Gerenciamento das Partes Interessadas e atualizou práticas.

6

2017 - 6ª Edição

Incluiu abordagens ágeis e adaptativas, com foco em entregar valor ao negócio.

7

2021 - 7ª Edição

Mudança radical de estrutura, baseada em princípios e domínios de desempenho em vez de processos.

UNC
Universidade do Contestado

PMBOK 6ª Edição: Estrutura

A 6ª edição do PMBOK (2017) organizava o conhecimento em gerenciamento de projetos em:

10 Áreas de Conhecimento


Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas

5 Grupos de Processos

Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento

49 Processos

Atividades específicas distribuídas entre os grupos de processos e áreas de conhecimento

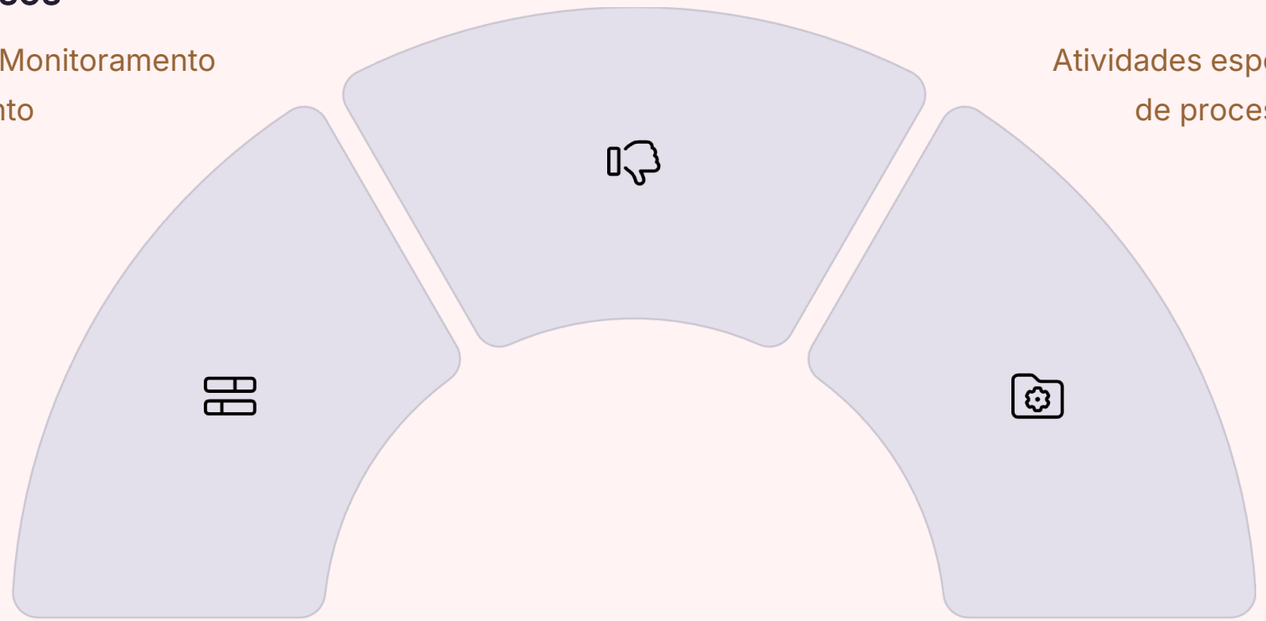

Esta estrutura permitia uma visão matricial do gerenciamento de projetos, facilitando a compreensão de quais processos deveriam ser executados em cada fase e área do projeto.

UNC
Universidade do Contestado

PMBOK 7ª Edição: Nova Abordagem

A 7ª edição do PMBOK (2021) trouxe uma mudança significativa, passando de uma abordagem prescritiva baseada em processos para uma visão mais flexível e adaptável, organizada em:

- **Princípios de Gerenciamento de Projetos:** 12 princípios orientadores que norteiam as boas práticas
- **Domínios de Desempenho do Projeto:** 8 domínios que representam categorias de atividades para a entrega de resultados
- **Modelos, Métodos e Artefatos:** Recursos práticos que podem ser apl
- **Sistemas de Entrega de Valor:** Foco em como os projetos contribuem para o valor organizacional



A nova abordagem é mais adaptável a diferentes metodologias (incluindo ágeis, híbridas e preditivas) e coloca mais ênfase na entrega de valor do que nos processos em si.

Universidade do Contestado

Princípios de Gerenciamento de Projetos

Os 12 princípios do PMBOK 7ª edição representam os fundamentos do gerenciamento eficaz de projetos:

Permitir mudança para alcançar o futuro estado previsto


Abraçar adaptabilidade e resiliência

Otimizar respostas a riscos

Navegar na complexidade

Incorporar qualidade nos processos e resultados

Adaptar com base no contexto

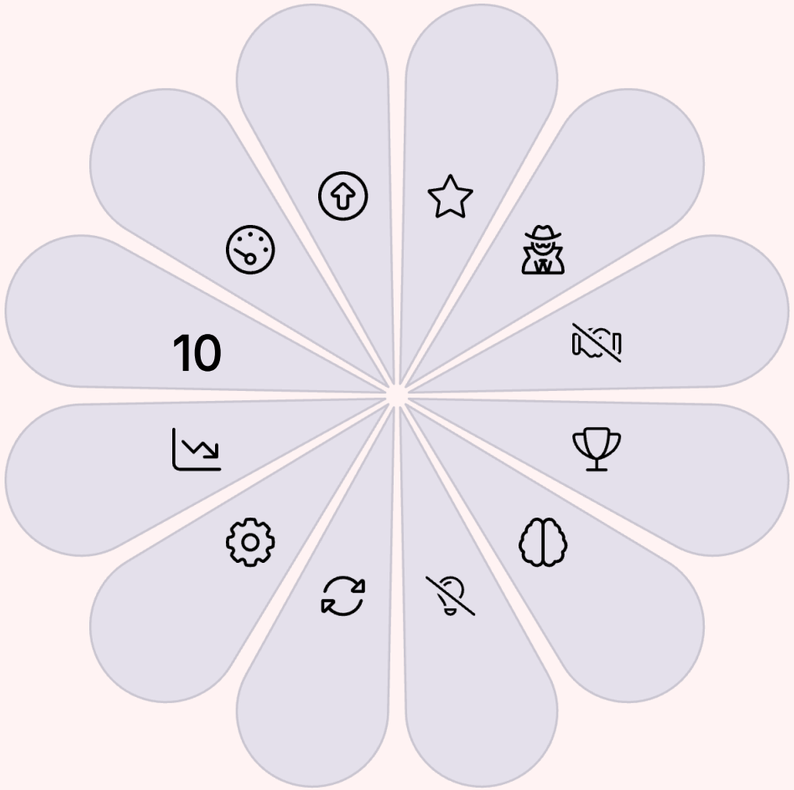

Ser um administrador diligente, respeitoso e cuidadoso

Criar um ambiente colaborativo da equipe do projeto

Engajar as partes interessadas efetivamente

Focar no valor

Reconhecer, avaliar e responder às interações do sistema

Demonstrar comportamentos de liderança

UNC
Universidade do Contestado

Domínios de Desempenho do Projeto

Os 8 domínios de desempenho representam grupos de atividades necessárias para entregar resultados de projeto eficazes:



Partes Interessadas

Atividades e funções associadas às partes interessadas, incluindo identificação, análise, engajamento e comunicação.



Equipe

Atividades e funções associadas à equipe do projeto, incluindo liderança, desenvolvimento e suporte.



Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida

Atividades relacionadas à escolha da abordagem mais adequada (preditiva, adaptativa, híbrida).



Planejamento

Atividades relacionadas ao planejamento do trabalho do projeto e criação de documentos.

UNC
Universidade
do Contestado

Domínios de Desempenho do Projeto (continuação)



Trabalho do Projeto

Atividades relacionadas à realização do trabalho definido para atingir os objetivos e entregar os resultados esperados.



Entrega

Atividades relacionadas à entrega do escopo e qualidade para alcançar os objetivos do projeto.



Medição

Atividades relacionadas à avaliação do desempenho do projeto e implementação de ações apropriadas.



Incerteza

Atividades relacionadas a riscos, ambiguidades e complexidades que afetam o projeto.

Esses domínios interagem entre si e devem ser gerenciados de forma holística para o sucesso do projeto.


UNC
Universidade
do Contestado

Sistemas de Entrega de Valor

O PMBOK 7ª edição enfatiza que os projetos não existem isoladamente, mas como parte de sistemas de entrega de valor que conectam estratégia e operações.

Componentes dos sistemas de entrega de valor:

- **Portfólios:** Coleção de projetos, programas e operações gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos
- **Programas:** Grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis se gerenciados individualmente
- **Projetos:** Esforços temporários para criar produtos, serviços ou resultados únicos
- **Produtos:** Artefatos produzidos para atender às necessidades dos usuários

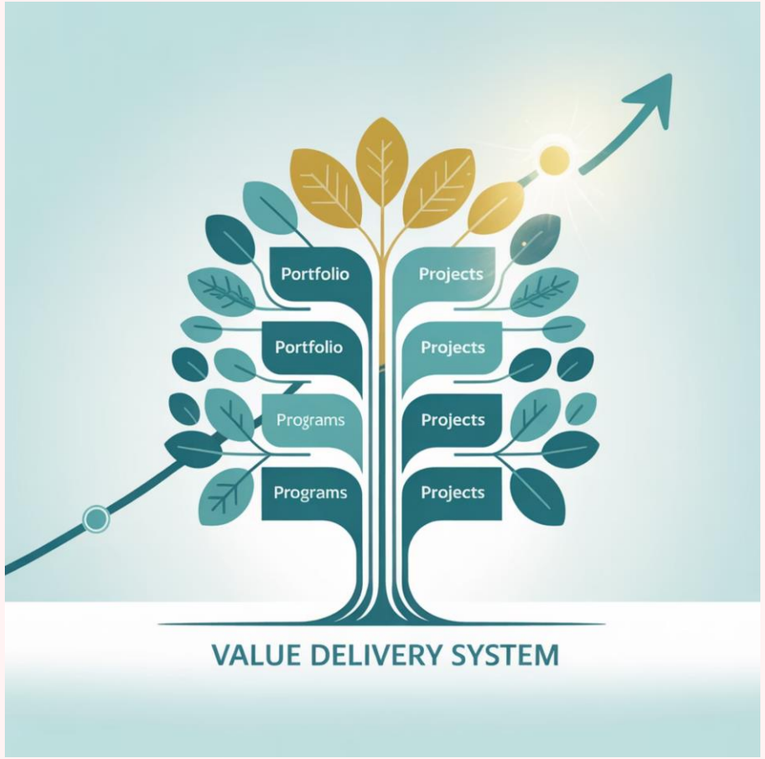

A abordagem de sistemas de entrega de valor reforça a importância de alinhar os projetos às necessidades organizacionais e maximizar o retorno do investimento.

UNC
Universidade
do Contestado

Tailoring: Adaptação das Práticas

O PMBOK 7ª edição enfatiza a importância de adaptar (tailoring) as práticas de gerenciamento ao contexto específico do projeto.

Fatores que influenciam a adaptação

- Tamanho e complexidade do projeto
- Setor e área de aplicação
- Cultura organizacional
- Nível de maturidade em gerenciamento de projetos
- Requisitos regulatórios
- Nível de inovação e incerteza

Elementos que podem ser adaptados

- Ciclo de vida e abordagem de desenvolvimento
- Processos e atividades
- Ferramentas e técnicas
- Métodos de comunicação
- Nível de documentação
- Frequência de revisões e controles



Certificações do PMI

O Project Management Institute oferece diversas certificações profissionais baseadas no conhecimento do PMBOK:



PMP (Project Management Professional)

A certificação mais reconhecida globalmente para gerentes de projetos. Requer experiência comprovada, educação formal e aprovação em exame.



CAPM (Certified Associate in Project Management)

Para profissionais iniciantes sem experiência extensa em projetos. Requer educação básica e aprovação em exame.



PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner)

Para profissionais que trabalham em ambientes ágeis. Requer experiência em projetos ágeis e aprovação em exame.



PgMP (Program Management Professional)

Para gerentes de programas experientes. Requer extensa experiência em gerenciamento de programas.

UNC
Universidade
do Contestado

PMO - Escritório de Gerenciamento de Projetos

O PMO (Project Management Office) é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas.

Tipos de PMO:

- **Suportivo:** Fornece suporte, templates e melhores práticas (baixo controle)
- **Controlador:** Fornece suporte e exige conformidade com metodologias (controle moderado)
- **Diretivo:** Assume o controle dos projetos, fornecendo gerentes de projeto (alto controle)



Funções comuns de um PMO:

- Desenvolvimento e manutenção de metodologias
- Treinamento e desenvolvimento de competências
- Gerenciamento de portfólio
- Monitoramento e relatórios de desempenho
- Auditoria e garantia de qualidade

UNC
Universidade
do Contestado

Aplicabilidade Profissional

O conhecimento sobre ciclo de vida de projetos, fatores críticos de sucesso e PMBOK é aplicável em diversas áreas profissionais:

Tecnologia da Informação

Desenvolvimento de software, implementação de sistemas, migração de plataformas, segurança da informação, projetos de transformação digital.

Engenharia e Construção

Obras de infraestrutura, construção civil, projetos industriais, desenvolvimento de produtos, pesquisa e desenvolvimento.

Negócios e Administração

Projetos de melhoria organizacional, reestruturação, fusões e aquisições, desenvolvimento de novos produtos e serviços.


Saúde

Implementação de novos processos, construção e renovação de instalações, pesquisa médica, desenvolvimento de dispositivos médicos.

UNC
Universidade
do Contestado

Competências do Gerente de Projetos

O PMI define no Triângulo de Talentos três conjuntos de competências essenciais para gerentes de projetos eficazes:

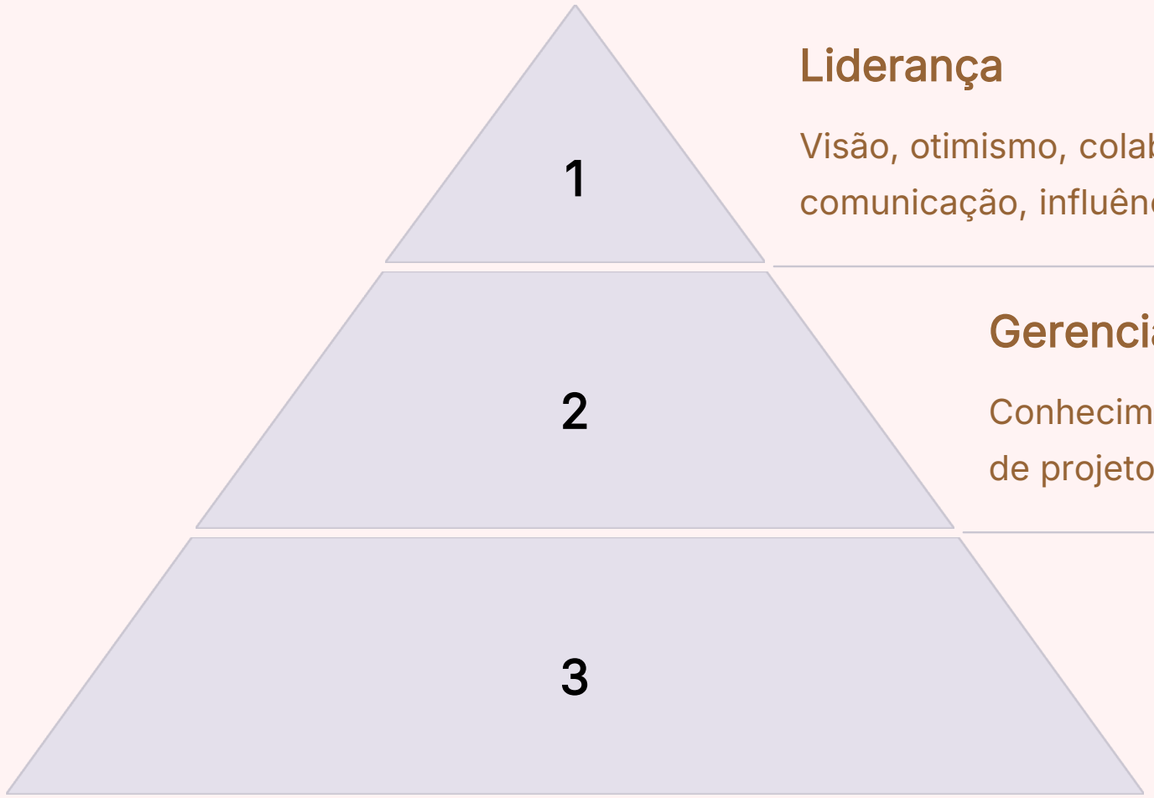

Liderança

Visão, otimismo, colaboração, resolução de conflitos, construção de equipes, motivação, comunicação, influência, tomada de decisões éticas

Gerenciamento Técnico de Projetos

Conhecimento das metodologias, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos conforme o PMBOK

Estratégia e Negócios

Conhecimento do setor, benefícios organizacionais, alinhamento estratégico, análise de negócios

Em um ambiente de negócios em constante evolução, os gerentes de projetos precisam desenvolver continuamente essas competências para entregar valor consistente.

UNC
Universidade
do Contestado

Recapitulação e Próximos Passos

1

Ciclo de Vida do Projeto

Compreensão das fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento, e como elas se aplicam a diferentes tipos de projetos.

2

Fatores Críticos de Sucesso

Identificação e gerenciamento dos elementos essenciais para o sucesso do projeto, como patrocínio executivo, objetivos claros, comunicação eficiente e equipe engajada.

3

PMBOK

Compreensão da estrutura e abordagem do guia de boas práticas em gerenciamento de projetos, incluindo princípios, domínios de desempenho e sistemas de entrega de valor.

4

Aplicação Prática

Na próxima aula, exploraremos ferramentas e técnicas específicas para aplicar esses conhecimentos em projetos reais, com exercícios práticos.

Dúvidas? Entre em contato: marcelo.semmer@unc.br

UNC
Universidade
do Contestado
