Projeto Integrador: Gerenciamento de Projetos na Prática

Universidade do Contestado - Campus Mafra/SC

Professor: Marcelo Semmer

Cursos: Engenharia de Software e Administração



Agenda do Curso

01

Introdução ao Gerenciamento de Projetos

Conceitos fundamentais e metodologias segundo o PMBOK Guide

02

Processos de Iniciação

Termo de Abertura e Identificação de Stakeholders

03

Projeto Integrador

Aplicação prática em equipes de até 4 alunos

04

Desenvolvimento Contínuo

Acompanhamento ao longo do semestre

05

Apresentação Final

Demonstração dos resultados e lições aprendidas

UNC
Universidade
do Contestado

Objetivos da Aula



Compreender os processos de iniciação de um projeto segundo as boas práticas do PMBOK Guide, aprendendo a:

- *Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP)*
- *Identificar stakeholders de forma estratégica*
- *Garantir alinhamento, apoio e clareza de objetivos desde o início do trabalho*
- *Iniciar o desenvolvimento do Projeto Integrador aplicado*

UNC
Universidade
do Contestado

A Importância da Fase de Iniciação

Por que a iniciação é crítica?

O início de um projeto é o momento mais decisivo para seu sucesso. As decisões tomadas nesta fase definem:

- *Escopo e limites do trabalho*
- *Recursos necessários*
- *Responsabilidades dos envolvidos*
- *Expectativas dos stakeholders*



Assim como uma construção depende de uma fundação sólida, um projeto bem-sucedido depende de uma iniciação bem estruturada.

UNC
Universidade
do Contestado

Processos de Iniciação segundo o PMBOK

Propósito

Formalizar a autorização do projeto e estabelecer uma visão compartilhada entre todos os envolvidos.

Principais Entregas

• Termo de Abertura do Projeto (TAP)• Registro das Partes Interessadas (Stakeholders)

Benefícios

• Define a justificativa do projeto• Cria comprometimento formal• Estabelece as bases para o planejamento detalhado

A precisão e a clareza nesta etapa aumentam significativamente as chances de que o projeto siga um caminho sustentável e alinhado aos objetivos estratégicos da organização.

UNC
Universidade
do Contestado

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Definição

> *Documento que autoriza oficialmente a existência de um projeto, delegando ao gerente de projetos a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais e tomar decisões.*

O TAP representa o "nascimento" formal do projeto na organização e é assinado por um patrocinador com autoridade suficiente para validar e comprometer recursos.



Conteúdo Mínimo do TAP

Identificação

• Título do projeto• Código de identificação• Data de elaboração

Justificativa

• Problema a ser resolvido• Oportunidade a ser explorada• Demanda a ser atendida

Objetivos

• Metas claras e mensuráveis• Benefícios esperados• Alinhamento estratégico

Escopo Resumido

• Entregas principais• O que está incluído• O que está excluído

UNC
Universidade
do Contestado

Conteúdo Mínimo do TAP (Continuação)

Cronograma Macro

• Principais marcos• Datas-chave• Duração estimada

Orçamento Estimado

• Custo total aproximado• Principais categorias de gastos• Fonte dos recursos

Riscos Iniciais

• Ameaças identificadas• Oportunidades potenciais• Restrições conhecidas

Aprovação

• Patrocinador designado• Gerente de Projetos nomeado• Critérios de sucesso

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo de TAP: App SuperRápido Delivery



- ***Nome:*** *App SuperRápido Delivery*
- ***Justificativa:*** *Atender demanda crescente por compras online pós-pandemia*
- ***Objetivo:*** *Lançar aplicativo funcional em 6 meses*
- ***Escopo:*** *App com catálogo de produtos, pagamento online e rastreamento de pedidos*
- ***Prazo:*** *01/08 a 31/01*
- ***Orçamento:*** *R$ 500 mil*
- ***Sponsor:*** *Diretor de Marketing e TI*

UNC
Universidade
do Contestado



Identificação de Stakeholders

Definição

> *Stakeholders são todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou ser impactados pelo projeto, positiva ou negativamente.*

É fundamental identificar e classificar os stakeholders logo no início do projeto para compreender suas expectativas, influência e como gerenciá-los ao longo do ciclo de vida do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Importância da Identificação Precoce

Antecipar Resistências

Identificar possíveis opositores ao projeto e planejar ações para mitigar resistências antes que se tornem obstáculos significativos.

Alinhar Expectativas

Compreender o que cada parte interessada espera do projeto e gerenciar essas expectativas desde o início para evitar decepções futuras.

Garantir Apoio

Identificar os stakeholders com maior poder e desenvolver estratégias para obter e manter seu apoio ao longo de todo o projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Ferramentas e Técnicas para Identificação

Brainstorming

Reunir a equipe inicial para gerar uma lista abrangente de todos os possíveis stakeholders, sem filtros iniciais.

Análise Documental


Examinar contratos, organogramas, atas de reuniões e outros documentos que possam indicar stakeholders relevantes.

Matriz de Poder x Interesse

Classificar os stakeholders conforme seu nível de poder sobre o projeto e seu grau de interesse nos resultados.

UNC
Universidade
do Contestado

Matriz de Poder x Interesse

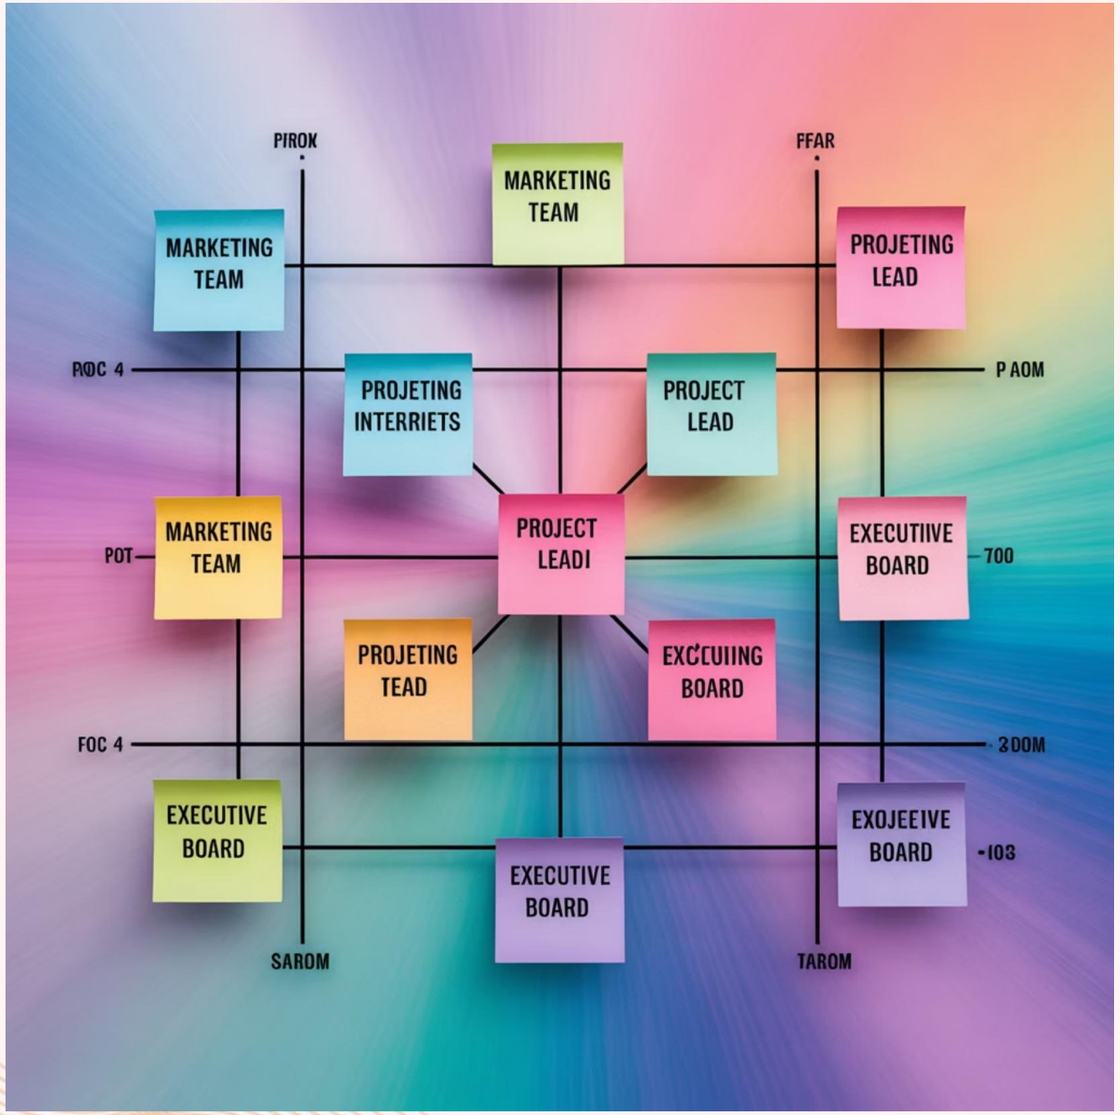

Como utilizar:

- ***Alto Poder/Alto Interesse:*** *Gerenciar de perto - comunicação frequente e envolvimento nas decisões*
- ***Alto Poder/Baixo Interesse:*** *Manter satisfeitos - informar regularmente, mas sem sobrecarregar*
- ***Baixo Poder/Alto Interesse:*** *Manter informados - comunicação constante sobre progresso*
- ***Baixo Poder/Baixo Interesse:*** *Monitorar - comunicação mínima, apenas quando necessário*

UNC
Universidade do Contestado

Exemplo: Stakeholders do App SuperRápido Delivery

Clientes Finais


Usuários do aplicativo que farão compras online

Operadores Logísticos

Responsáveis pelas entregas dos pedidos

Diretoria

Tomadores de decisão e patrocinadores

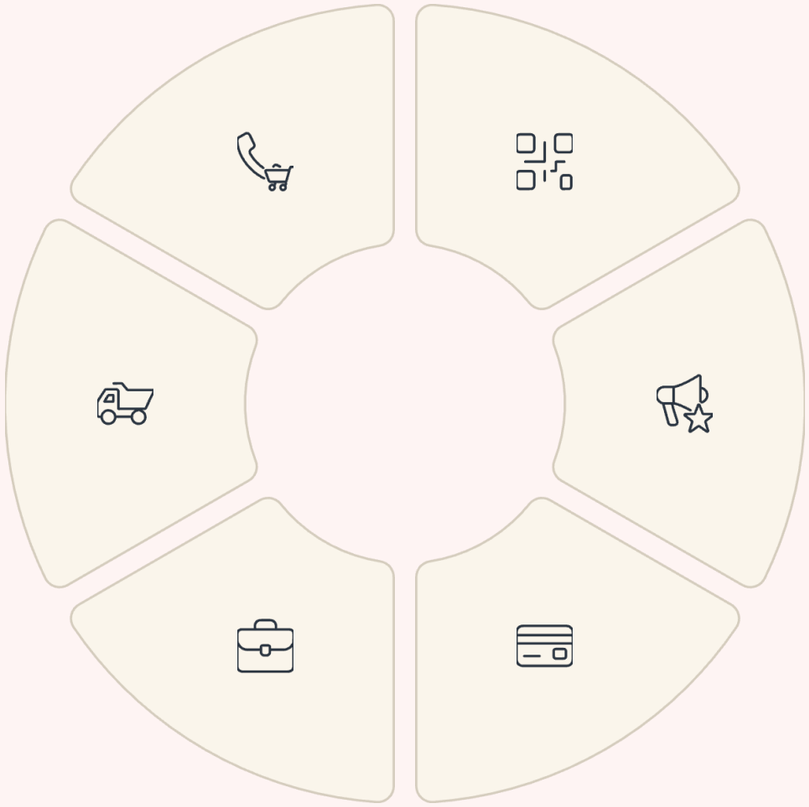

Equipe de TI

Desenvolvedores, testers e arquitetos de software

Marketing

Responsáveis pela divulgação e posicionamento

Fornecedores Tecnológicos

Gateway de pagamento, serviços de hospedagem

UNC
Universidade
do Contestado

Boas Práticas na Fase de Iniciação

Clareza e Objetividade

Redigir o TAP de forma clara e objetiva, evitando jargões técnicos em excesso que possam dificultar o entendimento por stakeholders não técnicos.

Revisão com Patrocinador

Sempre revisar o documento com o patrocinador antes da aprovação final, garantindo alinhamento e comprometimento real.

Estratégias de Comunicação

Classificar stakeholders e definir estratégias específicas de comunicação para cada grupo desde o início do projeto.

Propósito Claro

Garantir que todos os envolvidos entendam claramente o porquê e o para quê do projeto, criando senso de propósito compartilhado.

UNC
Universidade
do Contestado

Projeto Integrador

Aplicação Prática

Agora vamos aplicar os conceitos aprendidos em um projeto real que será desenvolvido ao longo do semestre!



Descrição do Projeto Integrador

Ao longo deste semestre, cada equipe de até 4 alunos deverá:

1. *Conceber uma ideia inovadora de produto ou serviço*
2. *Aplicar as técnicas de gerenciamento de projetos do PMBOK*
3. *Desenvolver toda a documentação necessária*
4. *Realizar entregas parciais para avaliação*
5. *Apresentar o resultado final ao término do semestre*



Este projeto integra teoria e prática, desenvolvendo habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

UNC
Universidade
do Contestado

Objetivos do Projeto Integrador

Desenvolver Competências Práticas

Aplicar conceitos teóricos de gerenciamento de projetos em situações reais, desenvolvendo habilidades necessárias para o mercado de trabalho.

Promover Trabalho em Equipe

Estimular a colaboração, comunicação e gestão de conflitos em um ambiente controlado, preparando os alunos para desafios profissionais futuros.

Integrar Disciplinas

Combinar conhecimentos de diferentes áreas (gerenciamento, tecnologia, administração) em um único projeto multidisciplinar.

Desenvolver Pensamento Crítico

Estimular a análise de problemas complexos e tomada de decisões baseadas em metodologias consagradas de mercado.

UNC
Universidade
do Contestado

Formação das Equipes

Requisitos:

- *Equipes de 2 a 4 integrantes*
- *Recomendado mesclar alunos de Engenharia de Software e Administração*
- *Cada equipe deve eleger um Gerente de Projeto*
- *Distribuição de papéis e responsabilidades entre os membros*
- *Prazo para formação: próxima aula*



A diversidade de perfis e competências enriquece o projeto e simula ambientes reais de trabalho, onde diferentes especialidades colaboram.

UNC
Universidade
do Contestado

Temas Sugeridos

Cada equipe pode escolher entre desenvolver um projeto em uma das seguintes áreas:



Aplicativo Mobile

Desenvolvimento conceitual de um aplicativo para smartphone que resolva um problema real da comunidade ou mercado.



Negócio Local

Plano de implementação de um pequeno negócio inovador na região, com foco em viabilidade e sustentabilidade.



Projeto Sustentável

Iniciativa com foco em sustentabilidade ambiental, social ou econômica que beneficie a comunidade de Mafra.



Melhoria Universitária

Proposta de melhoria para algum processo ou serviço da própria UnC, otimizando recursos ou experiência acadêmica.

UNC
Universidade
do Contestado

Cronograma do Projeto Integrador

1

Semana 1-2

Formação das equipes e definição do tema do projeto

2

Semana 3-4

Elaboração e entrega do Termo de Abertura do Projeto (TAP)

3

Semana 5-8

Desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto

4

Semana 9-10

Apresentação parcial e feedback do professor

5

Semana 11-15

Refinamento do projeto e preparação da documentação final

6

Semana 16

Apresentação final e entrega da documentação completa

UNC
Universidade
do Contestado

Entregas Obrigatórias

1

Termo de Abertura (TAP)

Documento completo seguindo as diretrizes do PMBOK, com justificativa, objetivos, escopo, cronograma macro, orçamento estimado e riscos iniciais.

2

Registro de Stakeholders

Identificação de todas as partes interessadas, com análise de poder/interesse e estratégias de engajamento para cada grupo.

3

Plano de Gerenciamento

Documento detalhando como o projeto será executado, monitorado e controlado, incluindo planos subsidiários (escopo, tempo, custo, qualidade, etc).

4

Apresentação Final

Slides profissionais e apresentação oral de 15-20 minutos com demonstração dos resultados alcançados e lições aprendidas.

UNC
Universidade
do Contestado

Critérios de Avaliação

Documentação (40%)

- *Clareza e completude*
- *Aderência às práticas do PMBOK*
- *Consistência entre documentos*
- *Qualidade da redação*

Aplicação Prática (30%)

- *Viabilidade da proposta*
- *Originalidade e inovação*
- *Valor agregado ao público-alvo*

Apresentações (20%)


- *Domínio do conteúdo*
- *Qualidade visual dos slides*
- *Capacidade de comunicação*
- *Gestão do tempo*

Trabalho em Equipe (10%)

- *Participação equilibrada*
- *Colaboração entre membros*
- *Resolução de conflitos*
- *Autoavaliação e avaliação pelos pares*

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo de Projetos Anteriores

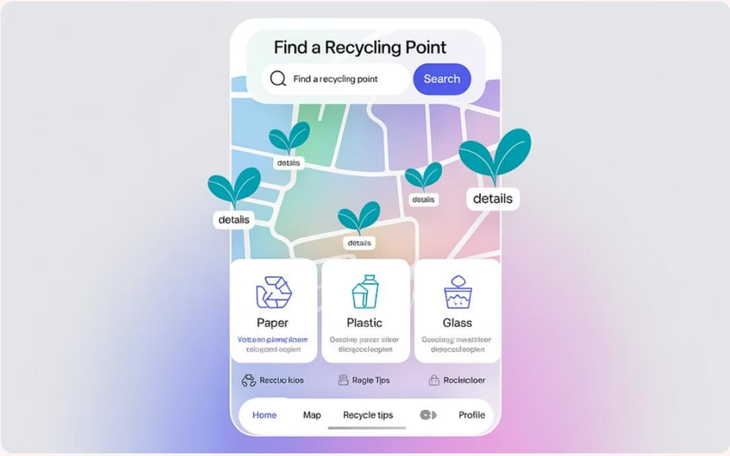


EcoMafra

Aplicativo de coleta seletiva que conecta pessoas com pontos de reciclagem na cidade, desenvolvido por alunos de 2022.



Mentoria UnC

Sistema de mentoria entre alunos veteranos e calouros, implementado como projeto piloto no campus em 2021.

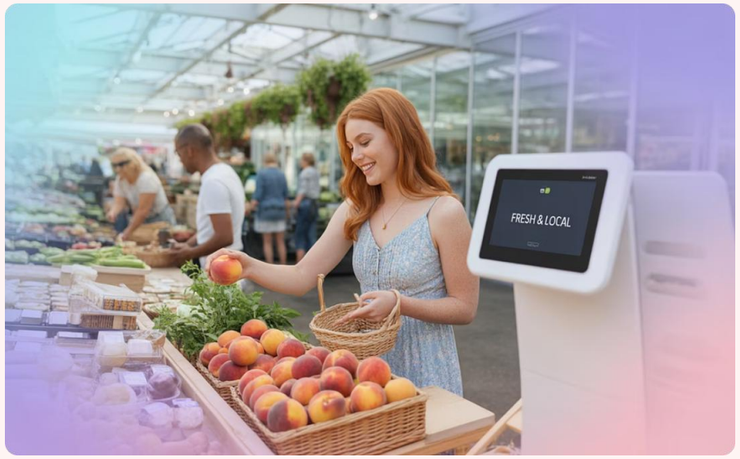

Feira Digital

Plataforma de vendas online para pequenos produtores rurais da região, conectando-os diretamente aos consumidores.

UNC
Universidade
do Contestado

Primeira Atividade: Elaboração do TAP

Instruções:

1. *Reunir a equipe e definir o tema do projeto*
2. *Pesquisar sobre o problema ou oportunidade escolhida*
3. *Elaborar o Termo de Abertura seguindo o template fornecido*
4. *Identificar todos os stakeholders relevantes*
5. *Preparar a primeira apresentação (5 minutos) para a próxima aula*

Dica importante:

Dedique tempo suficiente à justificativa do projeto. Um bom "porquê" torna todas as demais etapas mais claras e alinhadas.



Template do TAP


Nome do Projeto:	*[Título do projeto]*
Gerente do Projeto:	*[Nome do aluno responsável]*
Equipe:	*[Nomes dos membros da equipe]*
Data de Início:	*[Data]*
Data de Término Prevista:	*[Data]*
Justificativa:	*[Descrição do problema/oportunidade]*
Objetivos:	*[Objetivos SMART do projeto]*
Escopo (alto nível):	*[Principais entregas/exclusões]*
Principais Riscos:	*[Riscos iniciais identificados]*
Orçamento Estimado:	*[Valores aproximados]*
Aprovação:	*[Assinaturas]*

UNC
Universidade
do Contestado

Identificação de Stakeholders - Template

Para cada stakeholder identificado, sua equipe deve documentar:

- ***Nome/Cargo/Função:*** *Identificação clara da pessoa ou grupo*
- ***Classificação:*** *Interno ou externo ao projeto*
- ***Nível de Poder:*** *Alto, médio ou baixo*
- ***Nível de Interesse:*** *Alto, médio ou baixo*
- ***Postura:*** *Apoiador, neutro ou resistente*
- ***Principais Expectativas:*** *O que esperam do projeto*
- ***Estratégia de Engajamento:*** *Como gerenciar este stakeholder*

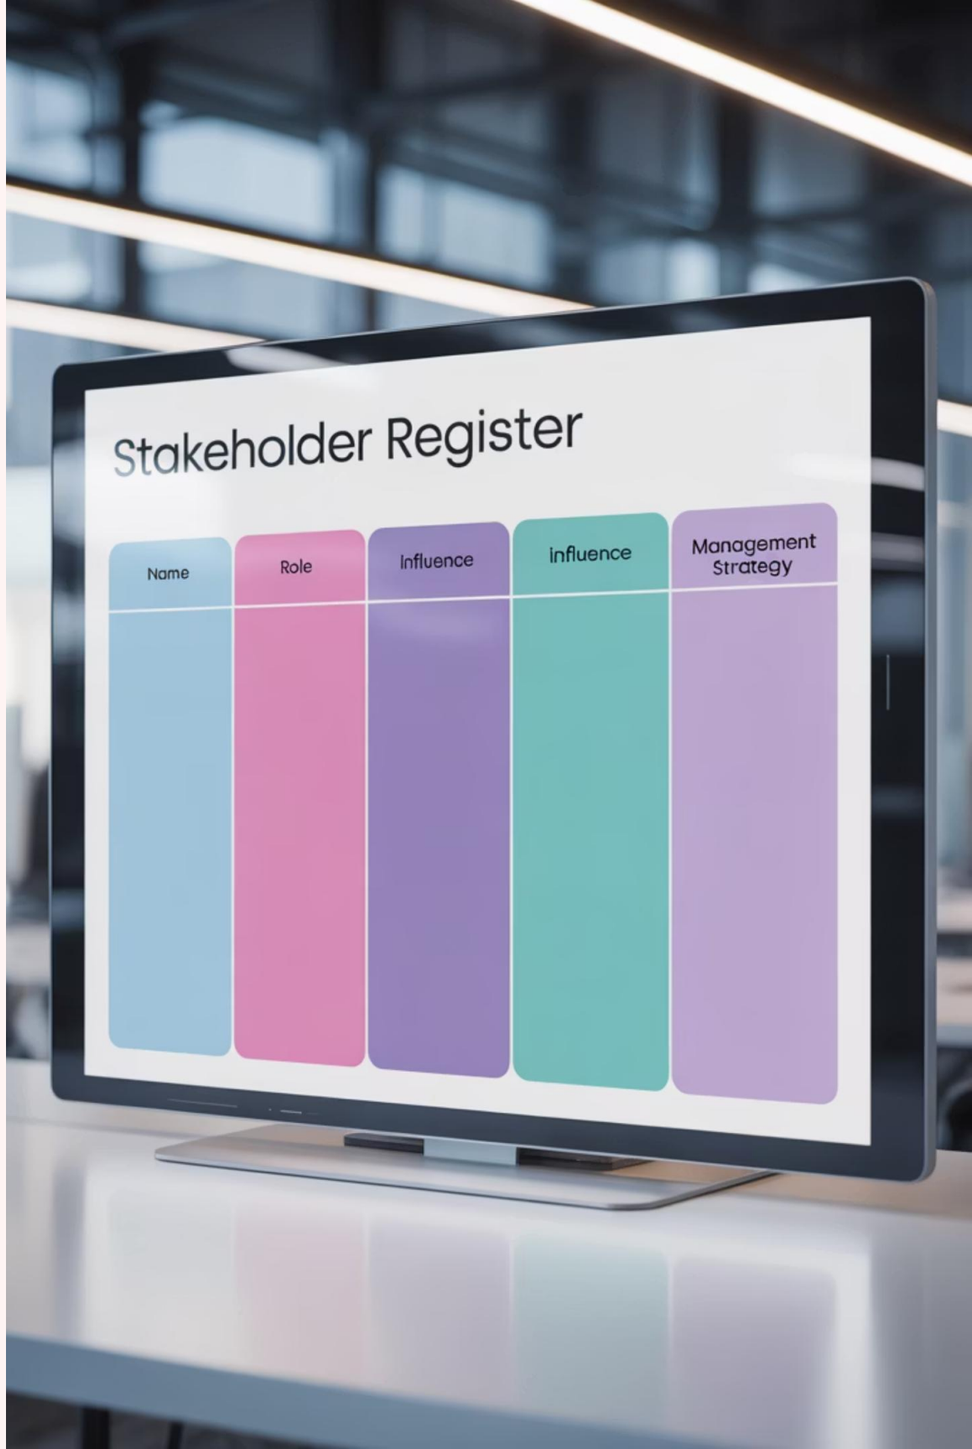

Recursos para o Projeto



Material Didático

Capítulos selecionados do PMBOK, apostilas e artigos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.



Horários de Monitoria

Atendimento semanal com monitores da disciplina para esclarecimento de dúvidas e orientações.



Templates

Modelos de documentos necessários para o projeto, facilitando a padronização e qualidade das entregas.



Vídeos e Tutoriais

Conteúdo complementar para aprofundamento em tópicos específicos de gerenciamento de projetos.

UNC
Universidade
do Contestado

Dúvidas Frequentes

Posso mudar o tema depois de iniciar o projeto?

Sim, mas apenas até a entrega do TAP. Após esta etapa, mudanças significativas de escopo podem comprometer o cronograma e a avaliação.

É necessário implementar o projeto na prática?

Não, o foco está na aplicação das metodologias de gerenciamento. Protótipos ou demonstrações conceituais são suficientes.

Como serão formadas as equipes multidisciplinares?

Haverá um momento para formação voluntária das equipes, com intervenção do professor apenas se necessário para garantir a diversidade.

O que acontece se um membro da equipe desistir?


A equipe deve documentar o ocorrido como um risco materializado e apresentar um plano de mitigação para redistribuir as responsabilidades.

UNC
Universidade
do Contestado

Próximos Passos

Para a próxima aula:

1. *Formar as equipes (até 4 membros)*
2. *Definir o tema do projeto*
3. *Iniciar a elaboração do TAP*
4. *Preparar dúvidas sobre o processo*

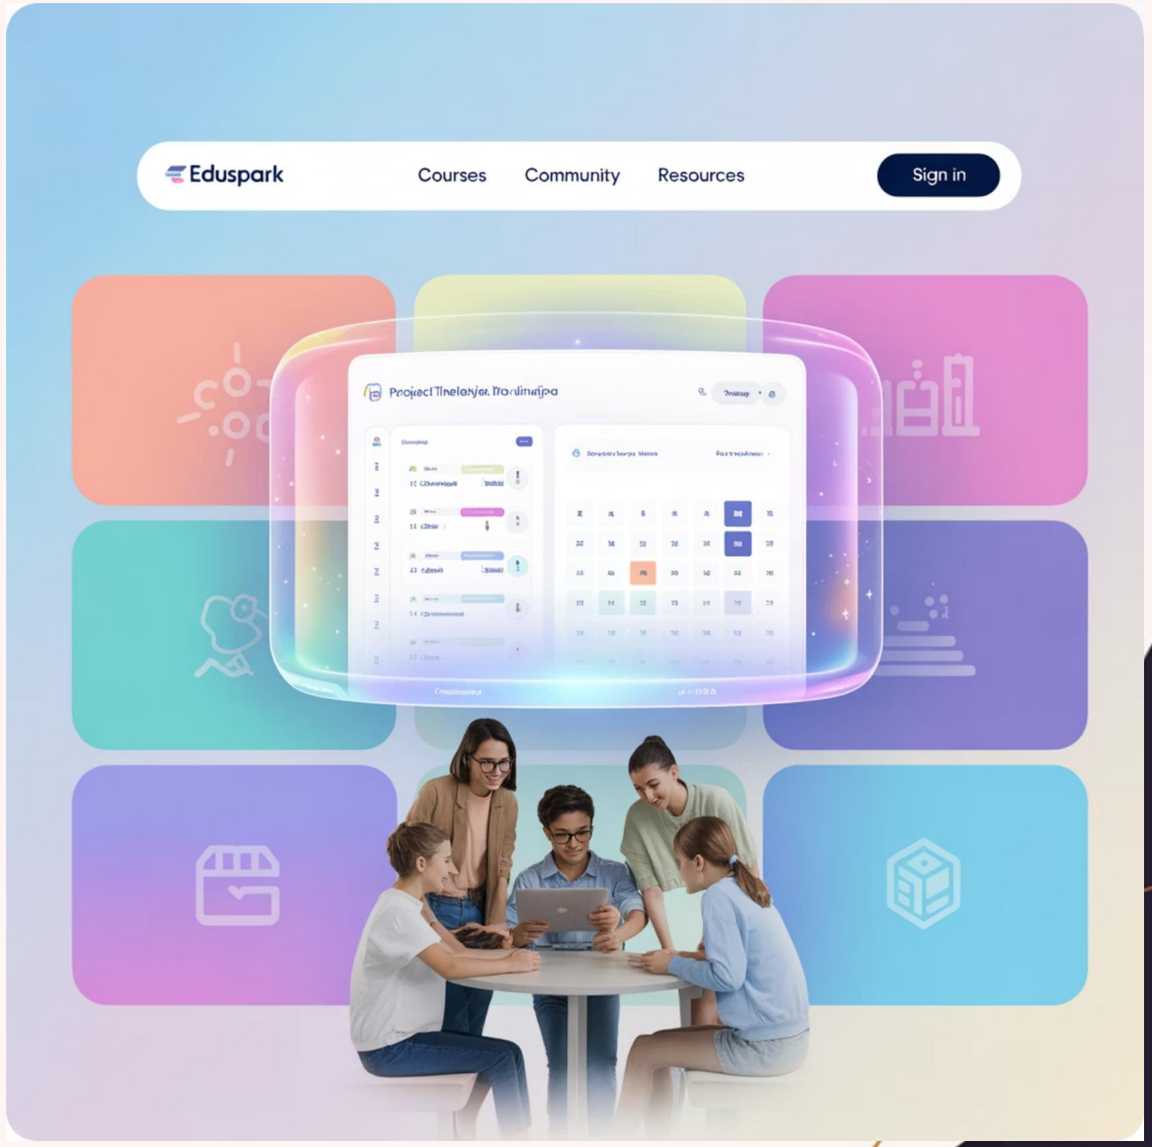

> *"O sucesso de um projeto começa com um bom planejamento e termina com uma excelente execução."*

UNC
Universidade
do Contestado
