UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UNC

GESTÃO DE PROJETOS

Engenharia de Software & Administração

Uma visão interdisciplinar da gestão de projetos modernos

Prof. Marcelo Semmer · Engenharia de Software e Administração de Empresas

UNC
Universidade
do Contestado

O QUE VAMOS APRENDER HOJE?

1	**Viabilidade** VPL · TIR · Payback
2	**Riscos** Identificação · Avaliação · Resposta
3	**Qualidade** Critérios · Indicadores · Controle
4	**Comunicação** Stakeholders · Canais · Frequência
5	**KPIs & Monitoramento** Prazo · Custo · Resultado
6	**ESG & Decisão** Sustentabilidade · GO / NO-GO

Um projeto não é gerenciado por uma única ferramenta. O gestor precisa conectar diferentes dimensões.

UNC
Universidade
do Contestado

Dois cursos. Uma sala. Uma aula.

💻 ENGENHARIA DE SOFTWARE

Tecnologia · Produto · Usuário · Desenvolvimento

📊 ADMINISTRAÇÃO

Negócio · Processos · Cliente · Estratégia

🔗 GESTÃO DE PROJETOS — Integra as duas perspectivas

Os conceitos desta aula são utilizados nas duas profissões. A diferença está no contexto — não no princípio.

UNC
Universidade
do Contestado

REFLEXÃO INICIAL

Antes de começar: pense no seu projeto.

💻 Eng. de Software

Qual problema técnico o seu projeto resolve? Quem será afetado se o sistema falhar?

📊 Administração

Qual problema de negócio o seu projeto resolve? Quem será afetado se a estratégia falhar?

🔗 Integrado


Quem deveria participar das decisões mais importantes do seu projeto?

UNC
Universidade
do Contestado

MÓDULO 1

VIABILIDADE

Vale a pena investir neste projeto?

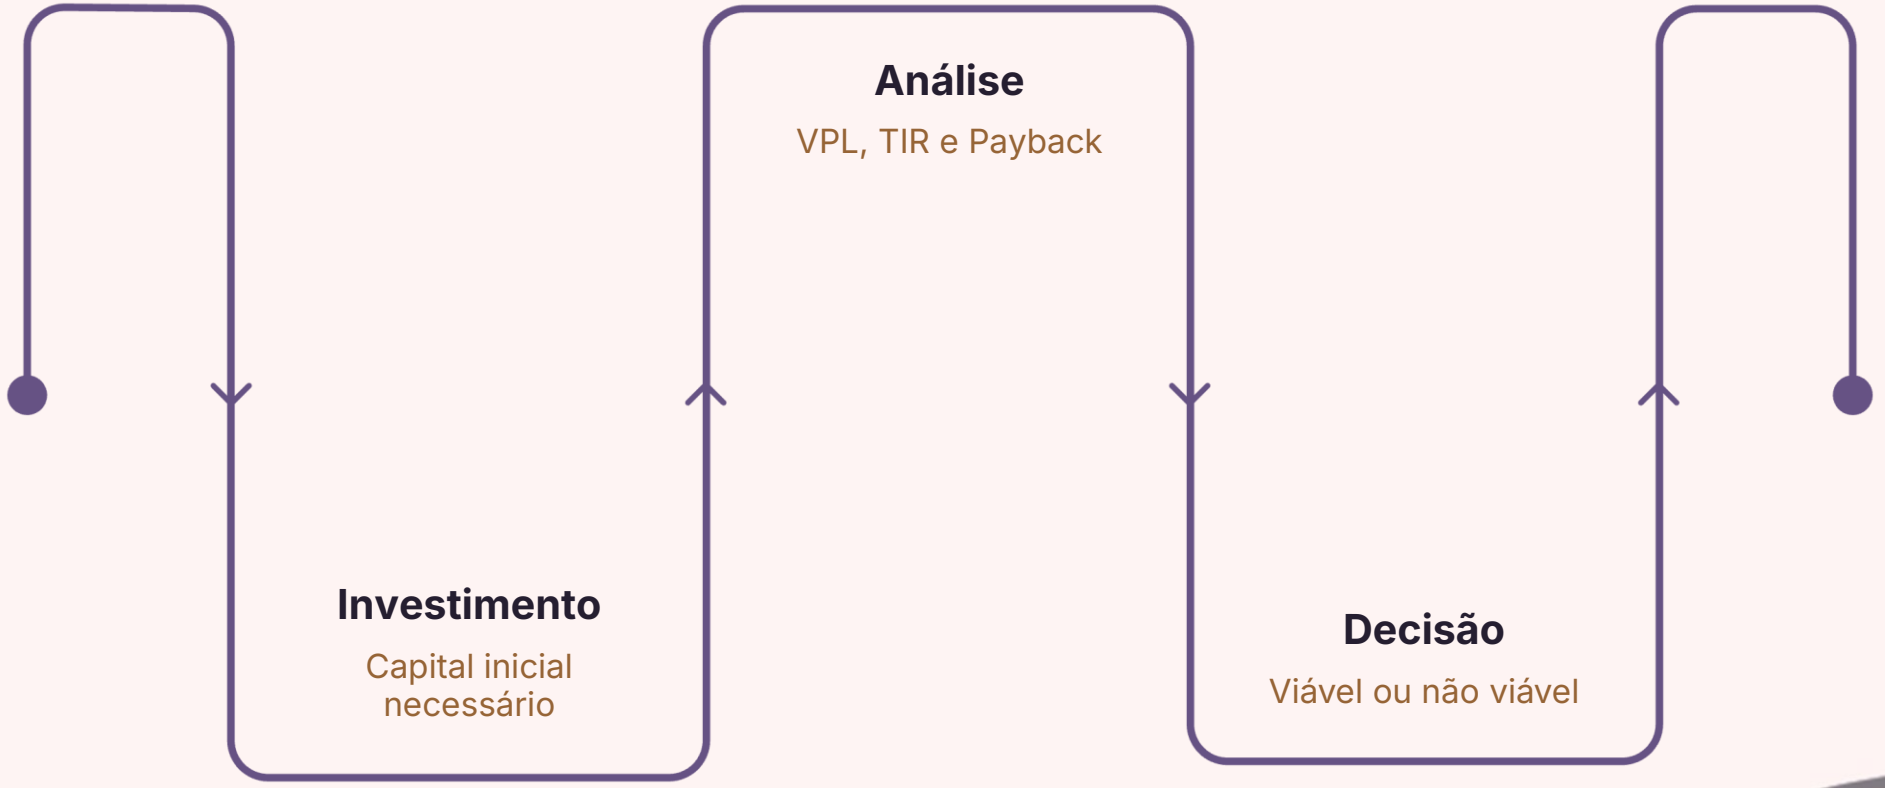

UNC
Universidade do Contestado

O que é Viabilidade de Projeto?

💻 ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Desenvolvimento de aplicativo mobile
- Implantação de plataforma SaaS
- Projeto de inteligência artificial
- Infraestrutura cloud / DevOps

O projeto entregará valor técnico e de negócio? Os recursos são suficientes?

📊 ADMINISTRAÇÃO

- Abertura de nova unidade
- Lançamento de novo produto
- Automação de processos administrativos
- Expansão comercial / nova filial

O investimento trará retorno suficiente? O mercado justifica a iniciativa?

Viabilidade responde: **Vale a pena fazer?** — antes de gastar tempo, dinheiro e energia.

UNC
Universidade
do Contestado

VPL — Valor Presente Líquido

Traz todos os fluxos de caixa futuros para o valor de hoje. Se o VPL for **positivo**, o projeto gera valor.

$$VPL = \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+i)^t} - I_0$$

💻 Eng. de Software

Desenvolvimento de e-commerce: investimento R$ 200 mil. Retorno estimado em redução de custos e aumento de vendas digitais ao longo de 3 anos.

📊 Administração

Abertura de nova filial: investimento R$ 300 mil. Projeção de receita incremental nos próximos 4 anos, descontada à taxa mínima de atratividade.

Regra: VPL > 0 → Viável · VPL = 0 → Indiferente · VPL < 0 → Inviável

UNC
Universidade
do Contestado

TIR — Taxa Interna de Retorno

É a taxa que torna o VPL igual a zero. Compara-se com a **Taxa Mínima de Atratividade (TMA)**.

💻 Eng. de Software

Plataforma SaaS com assinantes recorrentes: a TIR mensura se a taxa de retorno do produto digital supera o custo de capital da empresa.

Se TIR > TMA → vale investir no desenvolvimento.

📊 Administração

Programa de fidelização de clientes: a TIR mensura se o retorno sobre o investimento em marketing e CRM supera a taxa mínima exigida pelos sócios.

Se TIR > TMA → a estratégia é financeiramente atrativa.

TIR > TMA

✅ Projeto viável

TIR = TMA

⚖️ Indiferente

TIR < TMA

❌ Não recomendado

UNC
Universidade
do Contestado

Payback — Prazo de Retorno

Em quanto tempo o investimento inicial será recuperado?



Investimento Inicial

Fluxos Acumulados

Ponto de Payback

💻 Eng. de Software

Implantação de ERP: investimento de R$ 180 mil recuperado ao longo de 18 meses via redução de retrabalho e automação de processos internos.

📊 Administração

Lançamento de produto: investimento em produção e marketing recuperado em 12 meses por meio do volume de vendas e margem de contribuição.

UNC
Universidade
do Contestado

Como a análise de viabilidade difere entre as áreas?

💻 Engenharia de Software analisa:

- Custo de desenvolvimento (horas, equipe, licenças)
- Custo de infraestrutura (cloud, servidores, APIs)
- Manutenibilidade e escalabilidade futura
- Time-to-market e débito técnico

📊 Administração analisa:

- Investimento total e fontes de financiamento
- Mercado-alvo e potencial de receita
- Custos operacionais e margem de lucro
- Riscos de mercado e concorrência


🔗 **Integrado:** Que indicador seria mais importante para o diretor financeiro? E para o arquiteto de software? Ambos precisam conversar para chegar a uma decisão.

UNC
Universidade
do Contestado

MÓDULO 2

RISCOS

O que pode dar errado — e como nos preparar?

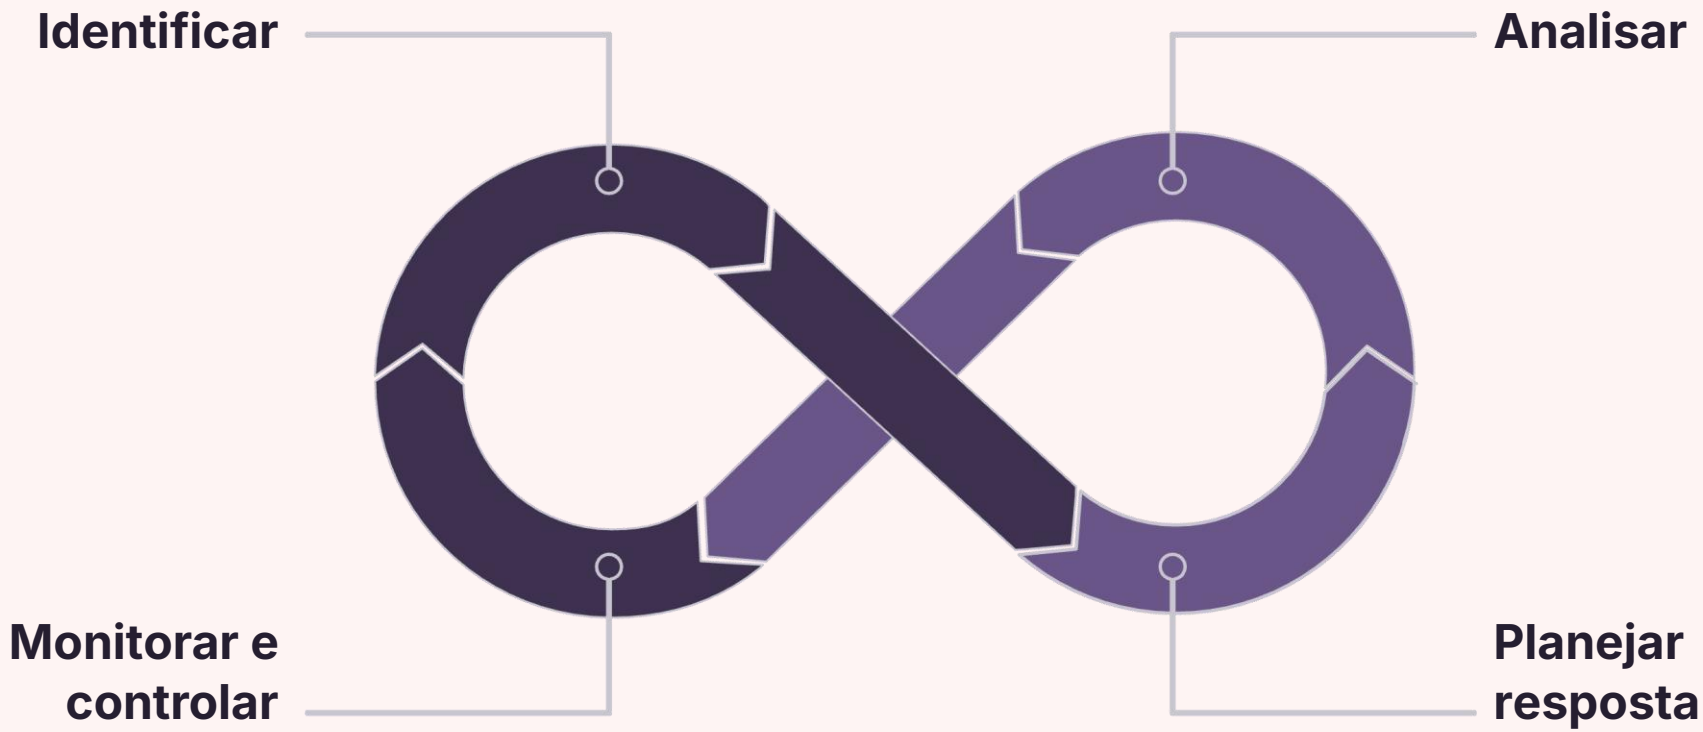

UNC Universidade do Contestado

O que é um Risco de Projeto?

Evento incerto que, se ocorrer, afeta positiva ou negativamente os objetivos do projeto.

💻 Eng. de Software — Exemplos

- Falha na integração com API externa atrasando a implantação
- Mudança de requisitos no meio do desenvolvimento
- Vulnerabilidade de segurança descoberta após o lançamento
- Indisponibilidade de infraestrutura cloud

📊 Administração — Exemplos

- Atraso de fornecedor estratégico comprometendo abertura de unidade
- Mudança regulatória que impacta o modelo de negócio
- Rejeição do produto pelo público-alvo
- Falta de pessoal capacitado para operar o novo processo

UNC
Universidade
do Contestado

Matriz de Probabilidade × Impacto

Classifica os riscos por gravidade para priorizar as respostas.



Priorize os riscos **CRÍTICOS** — eles podem paralisar o projeto se não forem tratados.

UNC
Universidade
do Contestado

Estratégias de Resposta a Riscos

🚫 Eliminar

Remover a causa do risco. Ex: trocar tecnologia instável por outra consolidada.

⬇️ Mitigar

Reduzir probabilidade ou impacto. Ex: fazer testes automatizados antes do deploy.

🔄 Transferir

Repassar o risco. Ex: contratar seguro ou cláusula contratual com fornecedor.

✅ Aceitar

Reconhecer o risco e preparar plano de contingência caso ele ocorra.

🗒️ 🖇️ **Reflexão:** Como a Engenharia de Software e a Administração tratariam diferentemente um risco de "atraso no cronograma"?

UNC
Universidade
do Contestado

Registro de Riscos — Estrutura

Risco	Prob.	Impacto	Classif.	Resposta	Responsável
Falha de integração API	Média	Alto	Crítico	Mitigar	Tech Lead
Atraso de fornecedor	Alta	Alto	Crítico	Transferir	Gerente
Resistência dos usuários	Média	Médio	Médio	Mitigar	RH / UX
Violação de dados (LGPD)	Baixa	Alto	Alto	Eliminar	DPO / Jurídico

O registro de riscos deve ser revisado em **todas as reuniões de acompanhamento** do projeto.

UNC
Universidade do Contestado

MÓDULO 3

QUALIDADE

Como garantir que o resultado do projeto atenda às expectativas?

UNC
Universidade
do Contestado

O que é Qualidade em um Projeto?

💻 Eng. de Software — Qualidade do Software

- Quantidade de bugs e falhas reportadas
- Disponibilidade e tempo de resposta do sistema
- Desempenho sob carga (testes de stress)
- Experiência do usuário (UX) e usabilidade
- Cobertura de testes automatizados

📊 Administração — Qualidade do Processo/Produto

- Satisfação e fidelização do cliente
- Taxa de retrabalho e desperdício
- Prazo de atendimento e entrega
- Conformidade dos processos com normas
- NPS (Net Promoter Score)

Qualidade não é um estágio final — é um processo contínuo de prevenção e melhoria.

UNC
Universidade
do Contestado

Critérios e Indicadores de Qualidade

Critério	Indicador	Meta	Forma de Medição
Disponibilidade do sistema	Uptime %	≥ 99,5%	Monitoramento automático
Satisfação do cliente	NPS	≥ 70	Pesquisa pós-venda
Conformidade de processo	% processos conformes	≥ 95%	Auditoria mensal
Qualidade de código	Cobertura de testes	≥ 80%	Ferramenta CI/CD

Reflexão: Qual desses indicadores seria prioritário para a equipe técnica? Qual seria prioritário para a diretoria?

UNC
Universidade
do Contestado

MÓDULO 4

STAKEHOLDERS & COMUNICAÇÃO

Quem precisa saber o quê — e quando?

UNC
Universidade
do Contestado

Quem são os Stakeholders?

Toda pessoa ou grupo que **influencia ou é influenciado** pelo projeto.

💻 Eng. de Software

- Product Owner / cliente interno
- Equipe de desenvolvimento
- UX Designer / QA
- Infraestrutura / DevOps
- Usuário final do sistema
- DPO (proteção de dados / LGPD)

📊 Administração

- Diretoria e conselho
- Gerentes de área envolvidos
- Colaboradores impactados
- Fornecedores e parceiros
- Clientes e consumidores finais
- Órgãos regulatórios

UNC
Universidade
do Contestado

Matriz de Comunicação

Stakeholder	Informação	Frequência	Canal	Responsável
Diretoria	Status geral e decisões críticas	Quinzenal	Reunião executiva	Gerente de Projeto
Equipe Técnica	Tarefas, bugs e deploys	Diária	Slack / Daily Scrum	Tech Lead
Usuários Finais	Novidades e manutenções	Mensal	E-mail / App	Marketing
Fornecedores	Prazos e entregas	Semanal	E-mail / Reunião	Gerente de Compras

Uma boa comunicação **previne conflitos, retrabalho e surpresas** no projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Engajamento de Stakeholders



O objetivo da comunicação é mover os stakeholders do nível atual para o nível **desejado**.

🔗 **Reflexão:** Quem deveria participar das decisões mais importantes do seu projeto? Esse stakeholder está engajado como líder ou como resistente?

MÓDULO 5

KPIs & MONITORAMENTO

Como sabemos se o projeto está indo bem?

UNC
Universidade
do Contestado

O que são KPIs?

Key Performance Indicators — indicadores que mostram se o projeto está atingindo seus objetivos.

⏱️ Prazo

% de entregas dentro do cronograma · Dias de atraso acumulado

💰 Custo

CPI (Cost Performance Index) · Variação de orçamento realizado vs. planejado

✅ Qualidade

Bugs por sprint · NPS do cliente · Taxa de conformidade de processo

⚠️ Risco

Número de riscos críticos ativos · Riscos mitigados no período

📈 Resultado

Valor entregue ao cliente · ROI parcial · Objetivos de negócio atingidos

UNC
Universidade
do Contestado

KPIs: Perspectivas Diferentes

💻 Engenharia de Software observa:

- Velocity da equipe (pontos por sprint)
- Taxa de falhas em produção (MTBF)
- Tempo de deploy e frequência de releases
- Cobertura de testes e dívida técnica
- Disponibilidade e tempo de resposta (SLA)

📊 Administração observa:

- % do orçamento consumido vs. entregue
- Receita gerada pelo projeto até o momento
- Satisfação dos clientes (NPS, CSAT)
- Tempo de atendimento e resolução
- Retorno sobre o investimento parcial (ROI)

🗞 **Reflexão:** Qual indicador seria mais importante para um gestor de negócios? Qual seria mais importante para o líder técnico? Ambos são necessários.

UNC
Universidade
do Contestado

Dashboard de Monitoramento — Semáforo do Projeto

🟢 VERDE

Dentro do planejado. Prazos, custos e qualidade conforme esperado. Continue executando.

🟡 AMARELO

Pontos de atenção. Algum indicador está se desviando. Requer ação preventiva imediata.

🔴 VERMELHO

Problemas importantes identificados. Desvio significativo. Requer decisão e plano de ação urgente.

O semáforo é uma ferramenta de **comunicação visual** para facilitar a tomada de decisão em reuniões executivas.

UNC
Universidade
do Contestado

MÓDULO 6

ESG

Ambiental · Social · Governança — o projeto tem responsabilidade além do resultado financeiro.

UNC
Universidade
do Contestado

ESG na Gestão de Projetos

Ambiental

Impacto ambiental do projeto: consumo de energia (servidores cloud, data centers), descarte de equipamentos, redução de papel e deslocamentos físicos com digitalização de processos.

Social

Impacto social: inclusão digital, acessibilidade do produto, condições de trabalho da equipe, diversidade no projeto, treinamento e capacitação dos colaboradores.

Governança

Boas práticas: transparência na comunicação, conformidade com LGPD, ética no uso de dados, controles internos, prestação de contas e gestão de riscos éticos.

UNC
Universidade
do Contestado

ESG — Duas Perspectivas

💻 Engenharia de Software

- **Ambiental:** Otimização do consumo de servidores cloud (green computing)
- **Social:** Acessibilidade do sistema (WCAG), inclusão digital, privacidade do usuário
- **Governança:** Conformidade com LGPD, segurança da informação, auditoria de código

📊 Administração

- **Ambiental:** Digitalização de processos reduzindo uso de papel e deslocamentos
- **Social:** Programa de capacitação dos funcionários, diversidade na equipe do projeto
- **Governança:** Transparência nos relatórios, controle orçamentário, ética com fornecedores


As ações de ESG devem ter relação **real** com o projeto — não podem ser genéricas ou decorativas.

UNC
Universidade
do Contestado

MÓDULO 7

TOMADA DE DECISÃO

GO · ADAPTAR · NO-GO



GO

Continuar conforme planejado.

ADAPTAR

Modificar o projeto conforme feedback.

NO-GO

Interromper e reconsiderar estratégias.

UNC
Universidade
do Contestado

O que fundamenta uma boa decisão?

💻 Eng. de Software analisa:

- Qualidade técnica do que foi entregue
- Dívida técnica acumulada
- Riscos de segurança e disponibilidade
- Capacidade da equipe de manter o ritmo
- Feedback dos usuários sobre a solução

📊 Administração analisa:

- Variação de custo e prazo
- ROI parcial e projeção de retorno
- Satisfação dos clientes e do mercado
- Mudanças no contexto de negócio
- Impacto estratégico de continuar ou parar

✅ GO

Continuar conforme planejado. Indicadores positivos, riscos controlados.

🔄 ADAPTAR

Modificar escopo, prazo ou recursos. Há desvios, mas o projeto ainda é viável.

🛑 NO-GO

Interromper ou reconsiderar. Viabilidade comprometida ou riscos inaceitáveis.

UNC
Universidade
do Contestado

ESTUDO DE CASO INTEGRADOR

Plataforma Digital de Vendas e Relacionamento

Uma empresa varejista pretende implantar uma nova plataforma digital de vendas e relacionamento com clientes.

💻 Olhar da Engenharia de Software

Arquitetura · Integrações · Segurança · IA · LGPD

📊 Olhar da Administração

Investimento · Processos · Clientes · Estratégia · ROI

UNC
Universidade
do Contestado

O Projeto — Visão Geral

📱 Tecnologia

Aplicativo mobile · E-commerce · Integração ERP · CRM · IA para atendimento

🏪 Negócio

Programa de fidelidade · Logística para pedidos online · Campanha de lançamento

👥 Pessoas

Treinamento dos funcionários · Equipe: Tecnologia + Administração + Marketing + Operações

⚖️ Conformidade

Adequação à LGPD · Segurança de dados · Transparência com o cliente

💰 **Investimento:** R$ 450.000

🗓️ **Prazo:** 10 meses

🏆 **Objetivo:** Aumentar vendas e reduzir custos

UNC
Universidade do Contestado

Objetivos do Projeto de Plataforma Digital

Aumentar Vendas

Canal digital gerando receita incremental além das lojas físicas.

Melhorar a Experiência do Cliente

App mobile, atendimento via IA (chatbot) e programa de fidelidade integrado.

Automatizar Processos

ERP integrado ao e-commerce: estoque, pedidos e logística em tempo real.

Reduzir Custos Operacionais

Automação de atendimento e processos manuais; menos retrabalho e falhas.

Utilizar Dados para Decisão

CRM e BI para análise de comportamento do cliente e desempenho do negócio.

UNC
Universidade
do Contestado

💻 Olhar da Engenharia de Software

Como a equipe técnica analisa este projeto?

Arquitetura e Integrações

- Arquitetura de microsserviços ou monolítico modular?
- Integração: App ↔ ERP 回 CRM ↔ IA 回 Gateway de pagamento
- Infraestrutura cloud: escalabilidade e disponibilidade
- APIs RESTful e segurança das integrações

Qualidade e Segurança

- LGPD: coleta e tratamento de dados dos clientes
- Testes: unitários, integração, carga e segurança
- Usabilidade (UX) do aplicativo mobile
- Manutenibilidade e documentação do código

🗞 **Reflexão:** Que decisão técnica deste projeto exige também conhecimento de negócios? (Ex: qual funcionalidade de IA priorizar no app?)

UNC
Universidade
do Contestado

📊 Olhar da Administração

Como a equipe de gestão analisa este projeto?

Financeiro e Estratégico

- ROI: quando o investimento de R$ 450 mil será recuperado?
- Impacto no faturamento: projeção de aumento de vendas digitais
- Redução de custo com automação de atendimento e processos
- Análise de concorrentes no canal digital

Pessoas e Processos

- Treinamento dos funcionários para operar o novo sistema
- Gestão da mudança: resistência interna à digitalização
- Logística: fluxo de pedidos online integrado à operação física
- Fornecedores: parceiros de entrega e tecnologia

🗞 **Reflexão:** Que decisão de negócio deste projeto depende de conhecimento técnico? (Ex: qual funcionalidade do CRM justifica o investimento?)

UNC
Universidade
do Contestado

O Olhar Integrado — Por que nenhum grupo resolve sozinho?

Se apenas a Eng. de Software atuar:

- ✅ Excelente solução técnica
- ❌ Sem análise de viabilidade financeira
- ❌ Sem estratégia de lançamento e marketing
- ❌ Sem treinamento e gestão da mudança
- ❌ Plataforma perfeita que ninguém usa

Se apenas a Administração atuar:

- ✅ Excelente estratégia de negócio
- ❌ Sem arquitetura técnica adequada
- ❌ Falhas, baixa disponibilidade, má UX
- ❌ Vulnerabilidades de segurança e LGPD
- ❌ Estratégia brilhante executada em sistema falho

PROJETOS REAIS SÃO INTERDISCIPLINARES.

O sucesso depende da integração entre visão técnica e visão de negócio.

UNC
Universidade
do Contestado

Viabilidade do Estudo de Caso

Dados do Projeto

- **Investimento inicial:** R$ 450.000
- **Prazo:** 10 meses
- **Benefícios esperados:** Aumento de receita digital + redução de custos operacionais
- **Payback estimado:** A calcular com base nas projeções

Perguntas de Viabilidade

- O VPL é positivo com a taxa de desconto da empresa?
- A TIR supera a taxa mínima de atratividade?
- O payback ocorre dentro do horizonte aceitável?

Perspectivas Disciplinares

💻 Eng. de Software analisa:

- Custo de desenvolvimento e infraestrutura
- Custo de manutenção e evolução do sistema
- Risco de atraso no cronograma técnico

📊 Administração analisa:

- Projeção de aumento de receita digital
- Economia com automação de atendimento
- Custo de treinamento e campanha de lançamento

UNC
Universidade
do Contestado

Riscos do Estudo de Caso

Risco	Perspectiva	Prob.	Impacto	Resposta
Falha na integração ERP App	Técnica	Média	Alto	Mitigar (testes)
Baixa adoção pelos clientes	Negócio	Média	Alto	Mitigar (UX + campanha)
Violação de dados / LGPD	Integrado	Baixa	Alto	Eliminar (DPO + segurança)
Atraso no treinamento dos funcionários	Negócio	Alta	Médio	Mitigar (cronograma antecipado)
Instabilidade do app no lançamento	Técnica	Média	Alto	Mitigar (beta fechado)

UNC
Universidade
do Contestado

KPIs do Estudo de Caso

Dimensão	KPI	Meta	Perspectiva
Prazo	% entregas no prazo por sprint	≥ 90%	+
Custo	Variação orçamentária (CPI)	CPI ≥ 0,95	
Qualidade	Taxa de bugs críticos em produção	≤ 2 por mês	
Qualidade	NPS dos clientes no app	≥ 65	+
Risco	Riscos críticos ativos	≤ 2	
Resultado	% aumento de vendas pelo canal digital	≥ 20% em 6 meses	

UNC
Universidade
do Contestado

ESG do Estudo de Caso

🌱 Ambiental

Ação: Digitalização do processo de pedidos elimina 100% do uso de papel nos formulários de compra e reduz deslocamentos físicos dos clientes até a loja.

🤝 Social

Ação: Programa de treinamento digital para todos os funcionários, incluindo colaboradores com menor afinidade tecnológica. Acessibilidade (WCAG) no aplicativo.

⚖️ Governança

Ação: Conformidade total com a LGPD: política de privacidade, consentimento de dados, DPO designado e auditorias trimestrais de segurança da informação.

UNC
Universidade
do Contestado

ATIVIDADE FINAL

PAINEL EXECUTIVO DO PROJETO

Esta não é uma nova atividade — é uma nova etapa do projeto que vocês já estão desenvolvendo no semestre.

💻 Grupos de Eng. de Software

Enfatizar os aspectos tecnológicos sem deixar de analisar os aspectos gerenciais.

📊 Grupos de Administração

Enfatizar os aspectos empresariais sem deixar de considerar tecnologia, dados e inovação.

UNC
Universidade do Contestado

O que o Painel Executivo deve responder?

1 **O projeto é viável?**

Investimento · Benefícios · VPL · TIR · Payback · Conclusão

2 **Quais são os principais riscos?**

Mínimo 3 riscos com: Probabilidade · Impacto · Classificação · Resposta · Responsável

3 **Como saberemos se está indo bem?**

Mínimo 5 KPIs contemplando: Prazo · Custo · Qualidade · Risco · Resultado

4 **Como garantiremos qualidade?**

Mínimo 3 critérios com Indicador · Meta · Forma de medição

UNC
Universidade
do Contestado

O Painel Executivo — continuação

1 Quem precisa receber informações?

Matriz de comunicação: mínimo 4 stakeholders com Informação · Frequência · Canal · Responsável

2 Como o projeto se relaciona com ESG?

1 ação Ambiental + 1 ação Social + 1 ação de Governança — com relação real ao projeto

3 Qual é a situação atual?

🟢 VERDE · 🟡 AMARELO · 🔴 VERMELHO — justificado com dados

4 Qual é a decisão do grupo?

✅ GO · 🔄 ADAPTAR · 🛑 NO-GO — justificada com as análises realizadas

UNC Universidade do Contestado

Apresentação dos Grupos — Simulação Executiva

Cada grupo terá **aproximadamente 3 minutos**. Apresentar de forma direta e objetiva — como em uma reunião de diretoria.

01

Projeto

Nome e objetivo central

ĆČ

Situação Atual

🟢 VERDE / 🟡 AMARELO / 🔴 VERMELHO

03

Principal KPI

O indicador mais crítico agora

04

Maior Risco

O risco de maior impacto e sua resposta

05

Qualidade & ESG

Principal critério de qualidade e ação ESG

06

Decisão

✅ GO · 🔄 ADAPTAR · 🛑 NO-GO — justificado

UNC
Universidade
do Contestado

Pontos de Reflexão Interdisciplinar

Durante todo o semestre, pergunte-se:

💻 Para a Engenharia de Software

Como a Administração analisaria esse problema técnico? Que impacto financeiro essa decisão técnica tem?

📊 Para a Administração

Como a Engenharia de Software resolveria esse problema operacional? Que tecnologia poderia otimizar esse processo?


🖇️ Para os dois cursos

Que decisão exige conhecimento das duas áreas? Quem deveria participar dessa decisão para ela ser completa?

Diferentes profissionais enxergam dimensões diferentes do mesmo projeto. O melhor projeto é aquele em que essas perspectivas se complementam.

UNC
Universidade do Contestado

Conexões entre os Conceitos da Aula

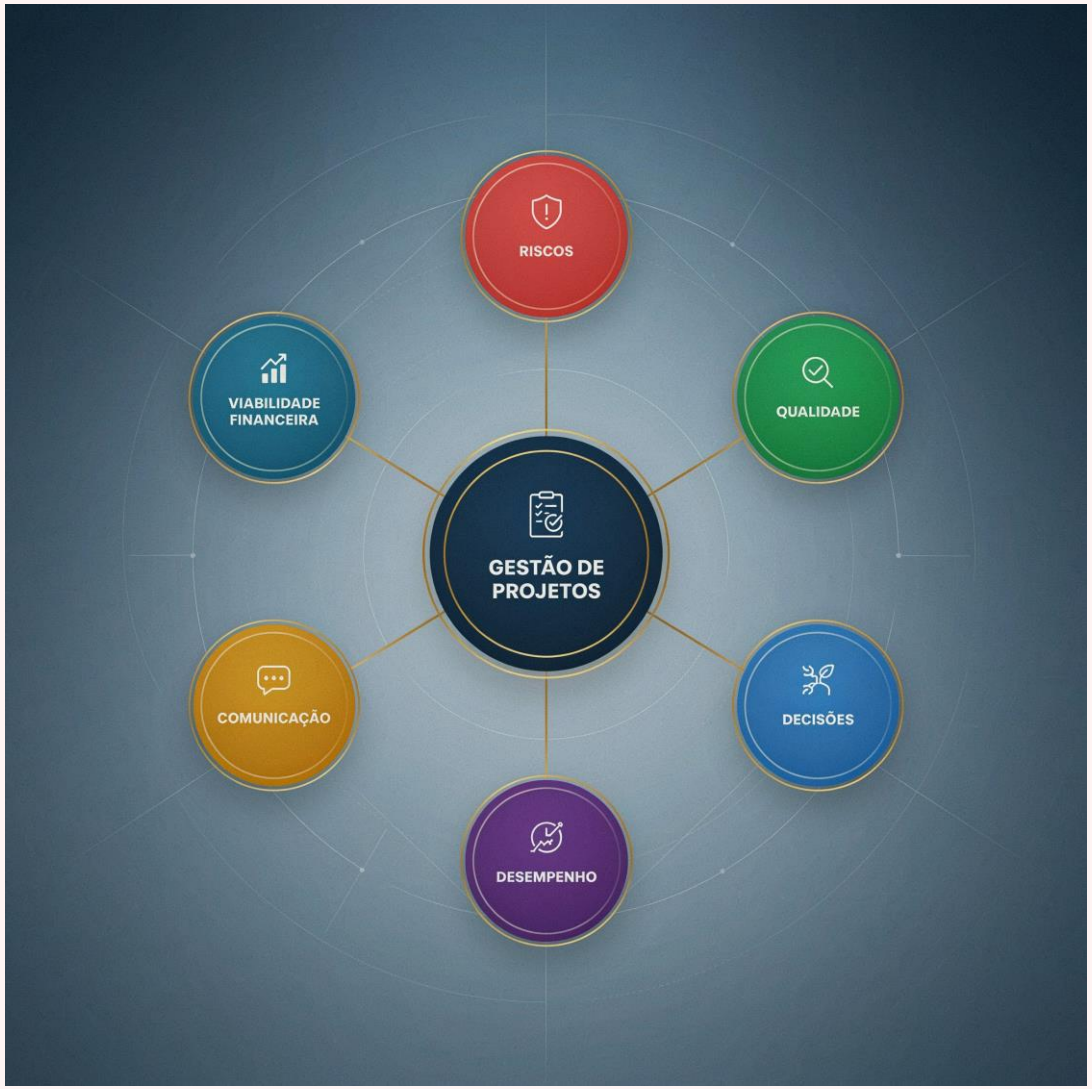

UNC
Universidade do Contestado

Síntese da Aula

O que aprendemos hoje:

- Viabilidade: VPL, TIR e Payback orientam a decisão de investir
- Riscos devem ser identificados, classificados e tratados proativamente
- Qualidade é monitorada com indicadores e metas mensuráveis
- Comunicação garante engajamento de todos os stakeholders
- KPIs mostram se o projeto está atingindo seus objetivos
- ESG integra responsabilidade socioambiental ao projeto
- A decisão GO/ADAPTAR/NO-GO deve ser fundamentada em dados

A grande mensagem:

> Projetos de sucesso integram a visão técnica da **Engenharia de Software** com a visão estratégica da **Administração**.
>
> Nenhuma área consegue entregar resultados completos sem a outra.

Próximos passos:

- Desenvolver o Painel Executivo do projeto do grupo
- Aplicar os conceitos desta aula ao projeto semestral
- Preparar apresentação de 3 minutos (reunião executiva)

UNC
Universidade do Contestado

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UNC

Obrigado!

Prof. Marcelo Semmer

Engenharia de Software · Administração de Empresas

"A tecnologia sem estratégia é uma ferramenta perdida."

"A estratégia sem tecnologia é uma oportunidade perdida."

Juntos, vocês têm as duas perspectivas. Usem-nas.

UNC
Universidade
do Contestado
